



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

---

# PLAN DE CONTINGENCIA

## MEMORIA DESCRIPTIVA

### I. NOMBRE DEL COMPONENTE

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA  
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL  
413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA – CURA MORI - PIURA – PIURA"

#### 1.0 UBICACIÓN:


<b>Departamento</b>	:	Piura
<b>Provincia</b>	:	Piura
<b>Distrito</b>	:	Cura Mori
<b>Centro Poblado</b>	:	Santa Rosa
<b>Local</b>	:	I.E. 14051 en su área libre

SE ha considerado utilizar parte del área libre del mismo terreno de la I.E. 14051, con un acceso existente a la calla posterior al ingreso principal con frente a la calle S/N ingresando por la calle Enrique Duarte, para la instalación de las aulas provisionales mientras duran el plazo de ejecución de obra de rehabilitación de la I.E N° 14051.



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

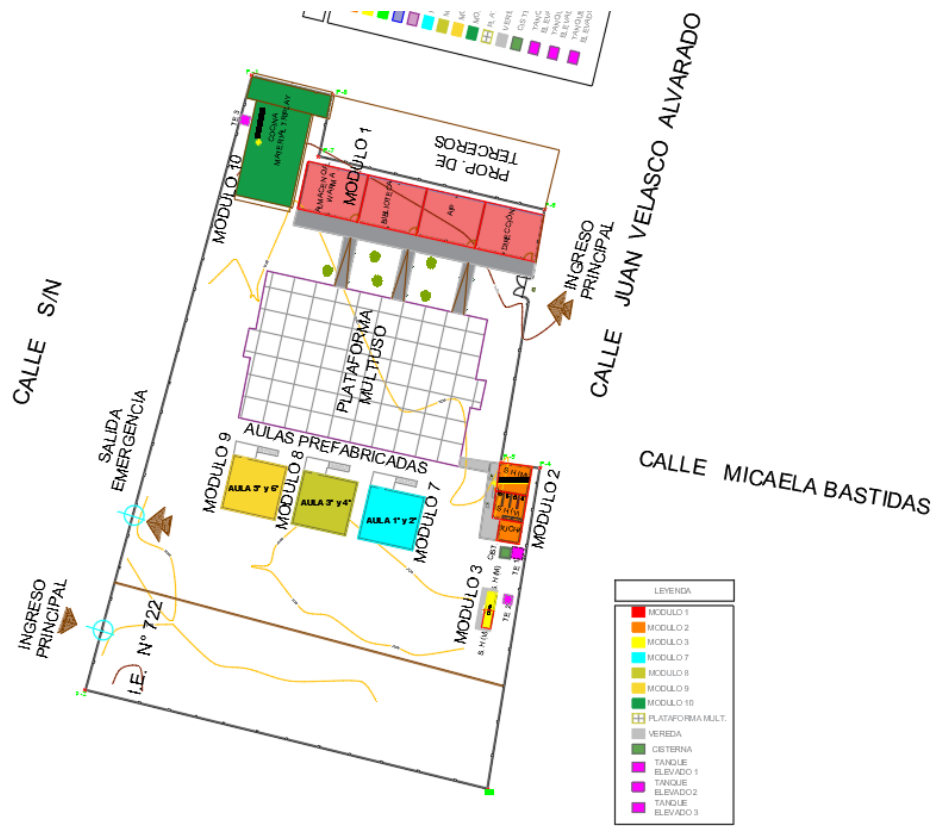

Vista del plano de existencias actual

## 2.0 DESCRIPCION DEL SERVICIO

Con la finalidad de que el servicio educativo este asegurado durante la ejecución de las obras del proyecto “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA – CURA MORI - PIURA – PIURA”, se ha considerado un plan de contingencia, optándose por la reubicación de las 03 aulas pre fabricadas de PRONIED, habilitándose la dirección así mismo se habilitará una batería de SS.HH provisionales, dichas aulas se reubicaran en el mismo terreno, propuesta que es realizada por la directora de la Institución Educativa, y la conformidad de los padres de familia para que su hijos reciban clases en dichas aulas mientras dura la construcción del proyecto.

En el presente componente se tendrá en consideración:

“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CODIGO LOCAL 413835 CP. SANTA ROSA – CURA MORI – PIURA - PIURA”



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

*"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"*

- Procurar un ambiente provisional para desarrollo de actividades relacionadas al dictado de clases durante el periodo de construcción del proyecto en mención.

Dichos ambientes serán adecuados para que se desarrollen las labores educativas y administrativas de la institución educativa durante el periodo de ejecución del proyecto, a su vez, se trasladarán los equipos y mobiliario con el que cuenta la institución educativa para el correcto desarrollo de las labores diarias.


### **3.0 OBJETIVO GENERAL:**

Brindar infraestructura provisional a los alumnos y maestros de la Institución Educativa Primaria N° 14051 – Santa Rosa – Cura Mori, mientras dura la intervención del proyecto de rehabilitación de la infraestructura.



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

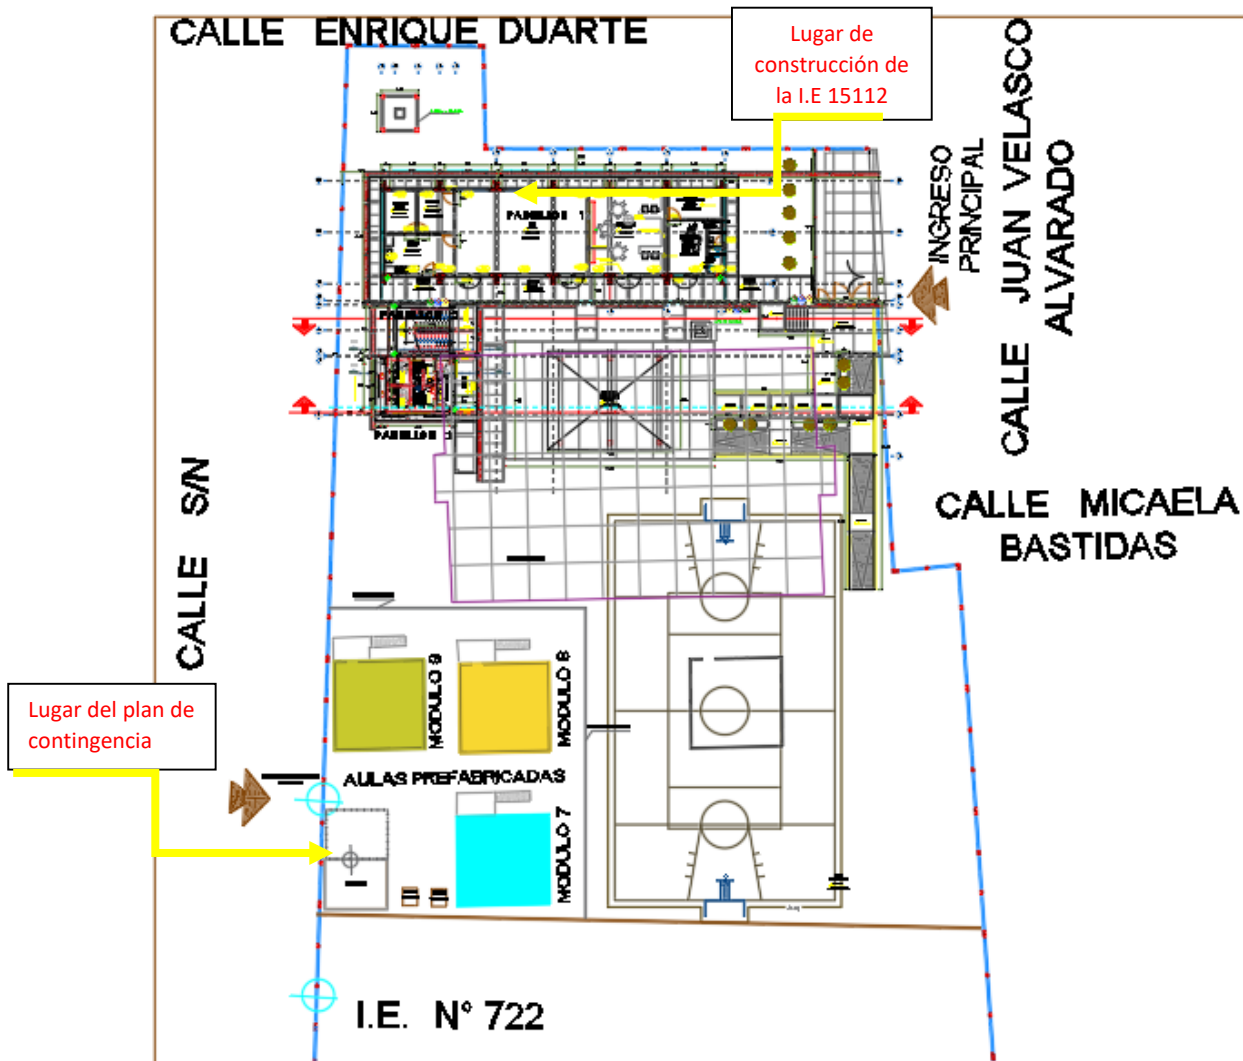

### 4.0 VALOR REFERENCIAL GENERAL

El Valor Referencial para ejecutar el presente componente asciende a la suma de **S/. 144,171.25 (CIENTO CUARENTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 25/100 Soles)**, con precios vigentes al mes de Diciembre de 2021, incluido IGV 18%, Gastos Generales 10% y Utilidad al 5%.



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

### 5.0 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución que demanda la presente actividad es de Quince (15) días calendario.

### 6.0 METAS

Los trabajos necesarios para la realización del presente servicio son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
<b>01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
<b>01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
02.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	<b>572.88</b>
02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	<b>572.88</b>
<b>01.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES PROVISIONALES</b>		
01.02.01	DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE AULA PRE FABRICADAS PRONIED N° 01	glb	1.00
01.02.02	DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE AULA PRE FABRICADAS PRONIED N° 02	glb	1.00
01.02.03	DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE AULA PRE FABRICADAS PRONIED N° 03	glb	1.00
01.02.01	DESMONTAJE Y TRASLADO DE AULA PRE FABRICADAS N° 01 A UGEL CORRESPONDIENTE	glb	1.00
01.02.01	DESMONTAJE Y TRASLADO DE AULA PRE FABRICADAS N° 02 A UGEL CORRESPONDIENTE	glb	1.00
01.02.01	DESMONTAJE Y TRASLADO DE AULA PRE FABRICADAS N° 03 A UGEL CORRESPONDIENTE	glb	1.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMBIENTE PARA DIRECCION	glb	1.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PROVISIONAL	glb	1.00
01.02.05	INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES	glb	1.00



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

*“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”*

---



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

1. REUBICACION TEMPORAL DE LA IE. A UN AREA LIBRE DEL MISMO TERRENO: De libre disponibilidad para poder ejecutar las metas propuestas del Plan de Contingencia; para lo cual su construcción será lo primero en realizarse en la ejecución del proyecto para poder emplearse como área para la reubicación temporal. Se reubicarán 3 aulas prefabricadas, de las cuales las 03 aulas serán las aulas prefabricadas del PRONIED y se distribuirán dentro del terreno perteneciente a la misma I.E. 14051 y, además para la dirección se habilitara un ambiente y por último se instalará un ambiente de SSHH provisional, el cual será usado por personal administrativo y los alumnos. Es decir, se van a usar un total de 06 ambientes para el Plan de Contingencia.
2. DESINSTALACION DE MODULOS PREFABRICADOS DE PRONIED (03 AULAS), TRASLADO A LA UGEL CORRESPONDIENTE, para SER DEVUELTAS.

**Es importante indicar que las aulas prefabricadas del PRONIED, una vez finalizado el proyecto serán desmontadas y se devolverán a la UGEL correspondientes.**
