Id	Nombre de tarea	Duración
1	ESTRUCTURAS	92 días
2	OBRAS PROVISIONALES	16 días
3	ALMACÉN, OFICINAS	2 días
4	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m	1 día
5	CERCO PROVISIONAL DE OBRA	1 día
6	SERVICIOS HIGIÉNICOS	1 día
7	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2 días
8	SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA	1 día
9	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1 día
10	SEÑALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD	14 días
11	TRABAJOS PRELIMINARES	92 días
12	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA	1 día
13	LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA	6 días
14	MOVILIZACION DE EQUIPO	1 día
15	MITIGACION AMBIENTAL	12 días
16	RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS	10 días
17	PREVENCION DE DAÑOS - DERRAME DE COMBUSTIBLES	10 días
18	DESMONTAJES	6 días
19	DESMONTAJE DE VENTANAS	1 día
20	DESMONTAJE DE PUERTAS	1 día
21	DESMONTAJE DE MATERIAL PREFABRICADO (DRYWALL)	6 días
22	DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE	1 día
23	DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO Y SOPORTE METÁLICO	1 día
24	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	1 día
25	DESMONTAJE DE COBERTURAS DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO (INC. LA ESTRUCTURA DE SOPORTE)	3 días
26	DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	3 días
27	DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL	1 día
28	DEMOLICIÓN , REMOCION Y RASQUETEO	7 días
29	DEMOLICIÓN DE PISO INC. C.P.- F.P.	3 días
30	DEMOLICIÓN DE VEREDAS, PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES	4 días
31	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO	1 día
32	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO	1 día
33	DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK (SOGA Y DE CANTO)	1 día
34	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO	1 día
35	DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO	4 días
36	DESMONTAJE DE CENTROS DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES)	1 día
37	DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	1 día
38	DESMONTAJE DE CABLE DE CENTRO DE LUZ	2 días
39	DESMONTAJE DE CABLE PARA TOMACORRIENTES	1 día
40	DESMONTAJE DE TABLEROS	1 día
41	PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19, PARA EL TRABAJO	92 días
42	ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID 19	1 día
43	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTRO DE TRABAJO	90 días
44	EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO E INCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO	90 días
45	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIA	90 días
46	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO	1 día
47	MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA	1 día
48	MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL	4 días
49	MOVIMIENTO DE TIERRAS	40 días
50	CORTE Y EXCAVACION	11 días
51	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMIENTOS CORRIDOS , PLATEAS Y ZAPATAS)	11 días
52	CORTE DE MATERIAL SUELTO R=150 m3/dia (EQUIPO)	1 día
53	RELLENO	9 días
54	RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO	7 días
55	RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO PREPARADO)	1 día
56	RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON)	1 día
57	CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE	3 días
58	NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION	3 días
59	MEJORAMIENTO DE TERRENO	6 días
60	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=50cm (COLOCACION DE OVER DE 1" A 6" - CON EQUIPO)	1 día
61	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=50cm (COLOCACION DE HORMIGON - CON EQUIPO)	1 día
62	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=30cm (COLOCACION DE HORMIGÓN - CON EQUIPO)	1 día
63	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)	1 día
64	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=10cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)	2 días
65	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL	13 días
66	ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=30m)	13 días
67	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km)	2 días
68	CONCRETO SIMPLE	28 días
69	SOLADO	3 días
70	SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=2", 1:12 C/H	3 días
71	SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H	2 días
72	FALSO PISO	2 días
73	FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"	2 días
74	CIMIENTOS	4 días
75	CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2	2 días
76	CIMIENTOS CORRIDOS; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	2 días
77	CONCRETO ARMADO	61 días
78	SOBRECIMIENTO	5 días
79	SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2	3 días
80	SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	5 días
81	SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2	5 días
82	ZAPATAS	5 días
83	ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2	2 días
84	ZAPATAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días
85	ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	3 días
86	ZAPATAS.- ENTIBADO H=1.5-2.2m	5 días
87	PLATEA DE CIMENTACIÓN	5 días
88	PLATEA DE CIMENTACION.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2	3 días
89	PLATEA DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	2 días
90	PLATEA DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2	2 días
91	VIGAS DE CIMENTACION	2 días
92	VIGAS DE CIMENTACION.- CONCRETO fc=210kg/cm2	1 día
93	VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1 día
94	VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2	2 días
95	COLUMNA	10 días
96	COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM2	7 días
97	COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	8 días
98	COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	8 días
99	VIGAS	23 días
100	VIGAS - CONCRETO 210Kg/cm2	3 días
101	VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	7 días
102	VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	7 días
103	LOSAS ALIGERADAS	14 días
104	LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2	2 días
105	LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	11 días
106	LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2	11 días
107	LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30	3 días
108	ESCALERAS	5 días
109	ESCALERAS.- CONCRETO fc=210 kg/cm2	1 día
110	ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	4 días
111	ESCALERAS.- ACERO fy=4200 kg/cm2	3 días
112	LOSA MACISA	14 días
113	LOSA MACISA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2	1 día
114	LOSA MACISA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1 día
115	LOSA MACISA.-ACERO fy=4200 kg/cm2	4 días
116	CUNETAS CON REJILLA	6 días
117	CUNETAS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2	1 día
118	CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	5 días
119	CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	1 día
120	CISTERNA	4 días
121	CISTERNA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2	1 día
122	CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días
123	CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2	3 días
124	TANQUE ELEVADO	2 días
125	TANQUE ELEVADO.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2	1 día
126	TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1 día
127	TANQUE ELEVADO.-ACERO fy=4200 kg/cm2	1 día
128	ESTRUCTURAS METALICAS	10 días
129	TIJERAL T-1(HABILITACION Y MONTAJE)	2 días
130	VIGUETA METALICA VG1 (HABILITACIÓN Y MONTAJE)	3 días
131	TEMPLADOR Y CRUZ DE SAN ANDRES	1 día
132	APOYOS METALICOS FIJO Y MOVIL	2 días
133	CANALETA FG 1.6MM	1 día
134	COBERTURA LIVIANA	3 días
135	ARQUITECTURA	102 días
136	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA	23 días
137	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1:4 e=1.5cm	14 días
138	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M : 1:1:4 e=1.5cm	9 días
139	FIERRO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS	1 día
140	TABIQUERIA MOVIL	3 días
141	MURO DE DRYWALL DOBLE ESTRUCTURA e= 1.5cm	3 días
142	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	63 días
143	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5	1 día
144	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES	7 días
145	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES	9 días
146	TARRAJEO DE COLUMNAS	12 días
147	TARRAJEO DE VIGAS	7 días
148	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	5 días
149	VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)	4 días
150	BRUÑAS SEGÚN DETALLE	5 días
151	CIELORRASOS	10 días
152	CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5	10 días
153	PISOS Y PAVIMENTOS	90 días
154	CONTRAPISOS	3 días
155	CONTRAPISO DE 40 mm	3 días
156	PISOS	76 días
157	PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DOMINE MATE BLANCO- ALTO TRANSITO	11 días
158	PISO CERAMICO 45 x 45 ALTO TRÁNSITO	1 día
159	PISO DE CONCRETO EN PATIOS f'c=175kg/cm2; e=15cm FROTACHADO	2 días
160	PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1 día
161	PISO DE GOMA ECOLOGICO DE CAUCHO SUMINISTRO E INSTALACION	1 día
162	VEREDAS Y RAMPAS	4 días
163	VEREDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	2 días
164	RAMPAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	1 día
165	VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1 día
166	ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS	40 días
167	ZOCALOS	6 días
168	ZOCALO CERAMICO 45X45	6 días
169	CONTRAZOCALOS	13 días
170	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 20X60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE-ALTO TRANSITO	6 días
171	CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO	7 días
172	COBERTURAS	9 días
173	COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)	9 días
174	CARPINTERIA DE MADERA	9 días
175	PUERTA MACHIEMBRADA	5 días
176	PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4"	4 días
177	PIZARRA ACRILICA	4 días
178	CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA	90 días
179	CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA	3 días
180	PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES	5 días
181	ASTA DE BANDERA	1 día
182	BARANDA METALICA EN ESCALERA	1 día
183	REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)	5 días
184	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCUENTRO METALICO ENTRE SOBRETECHO Y PARAPETO	4 días
185	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm	2 días
186	BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS	2 días
187	ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO	2 días
188	ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA	1 día

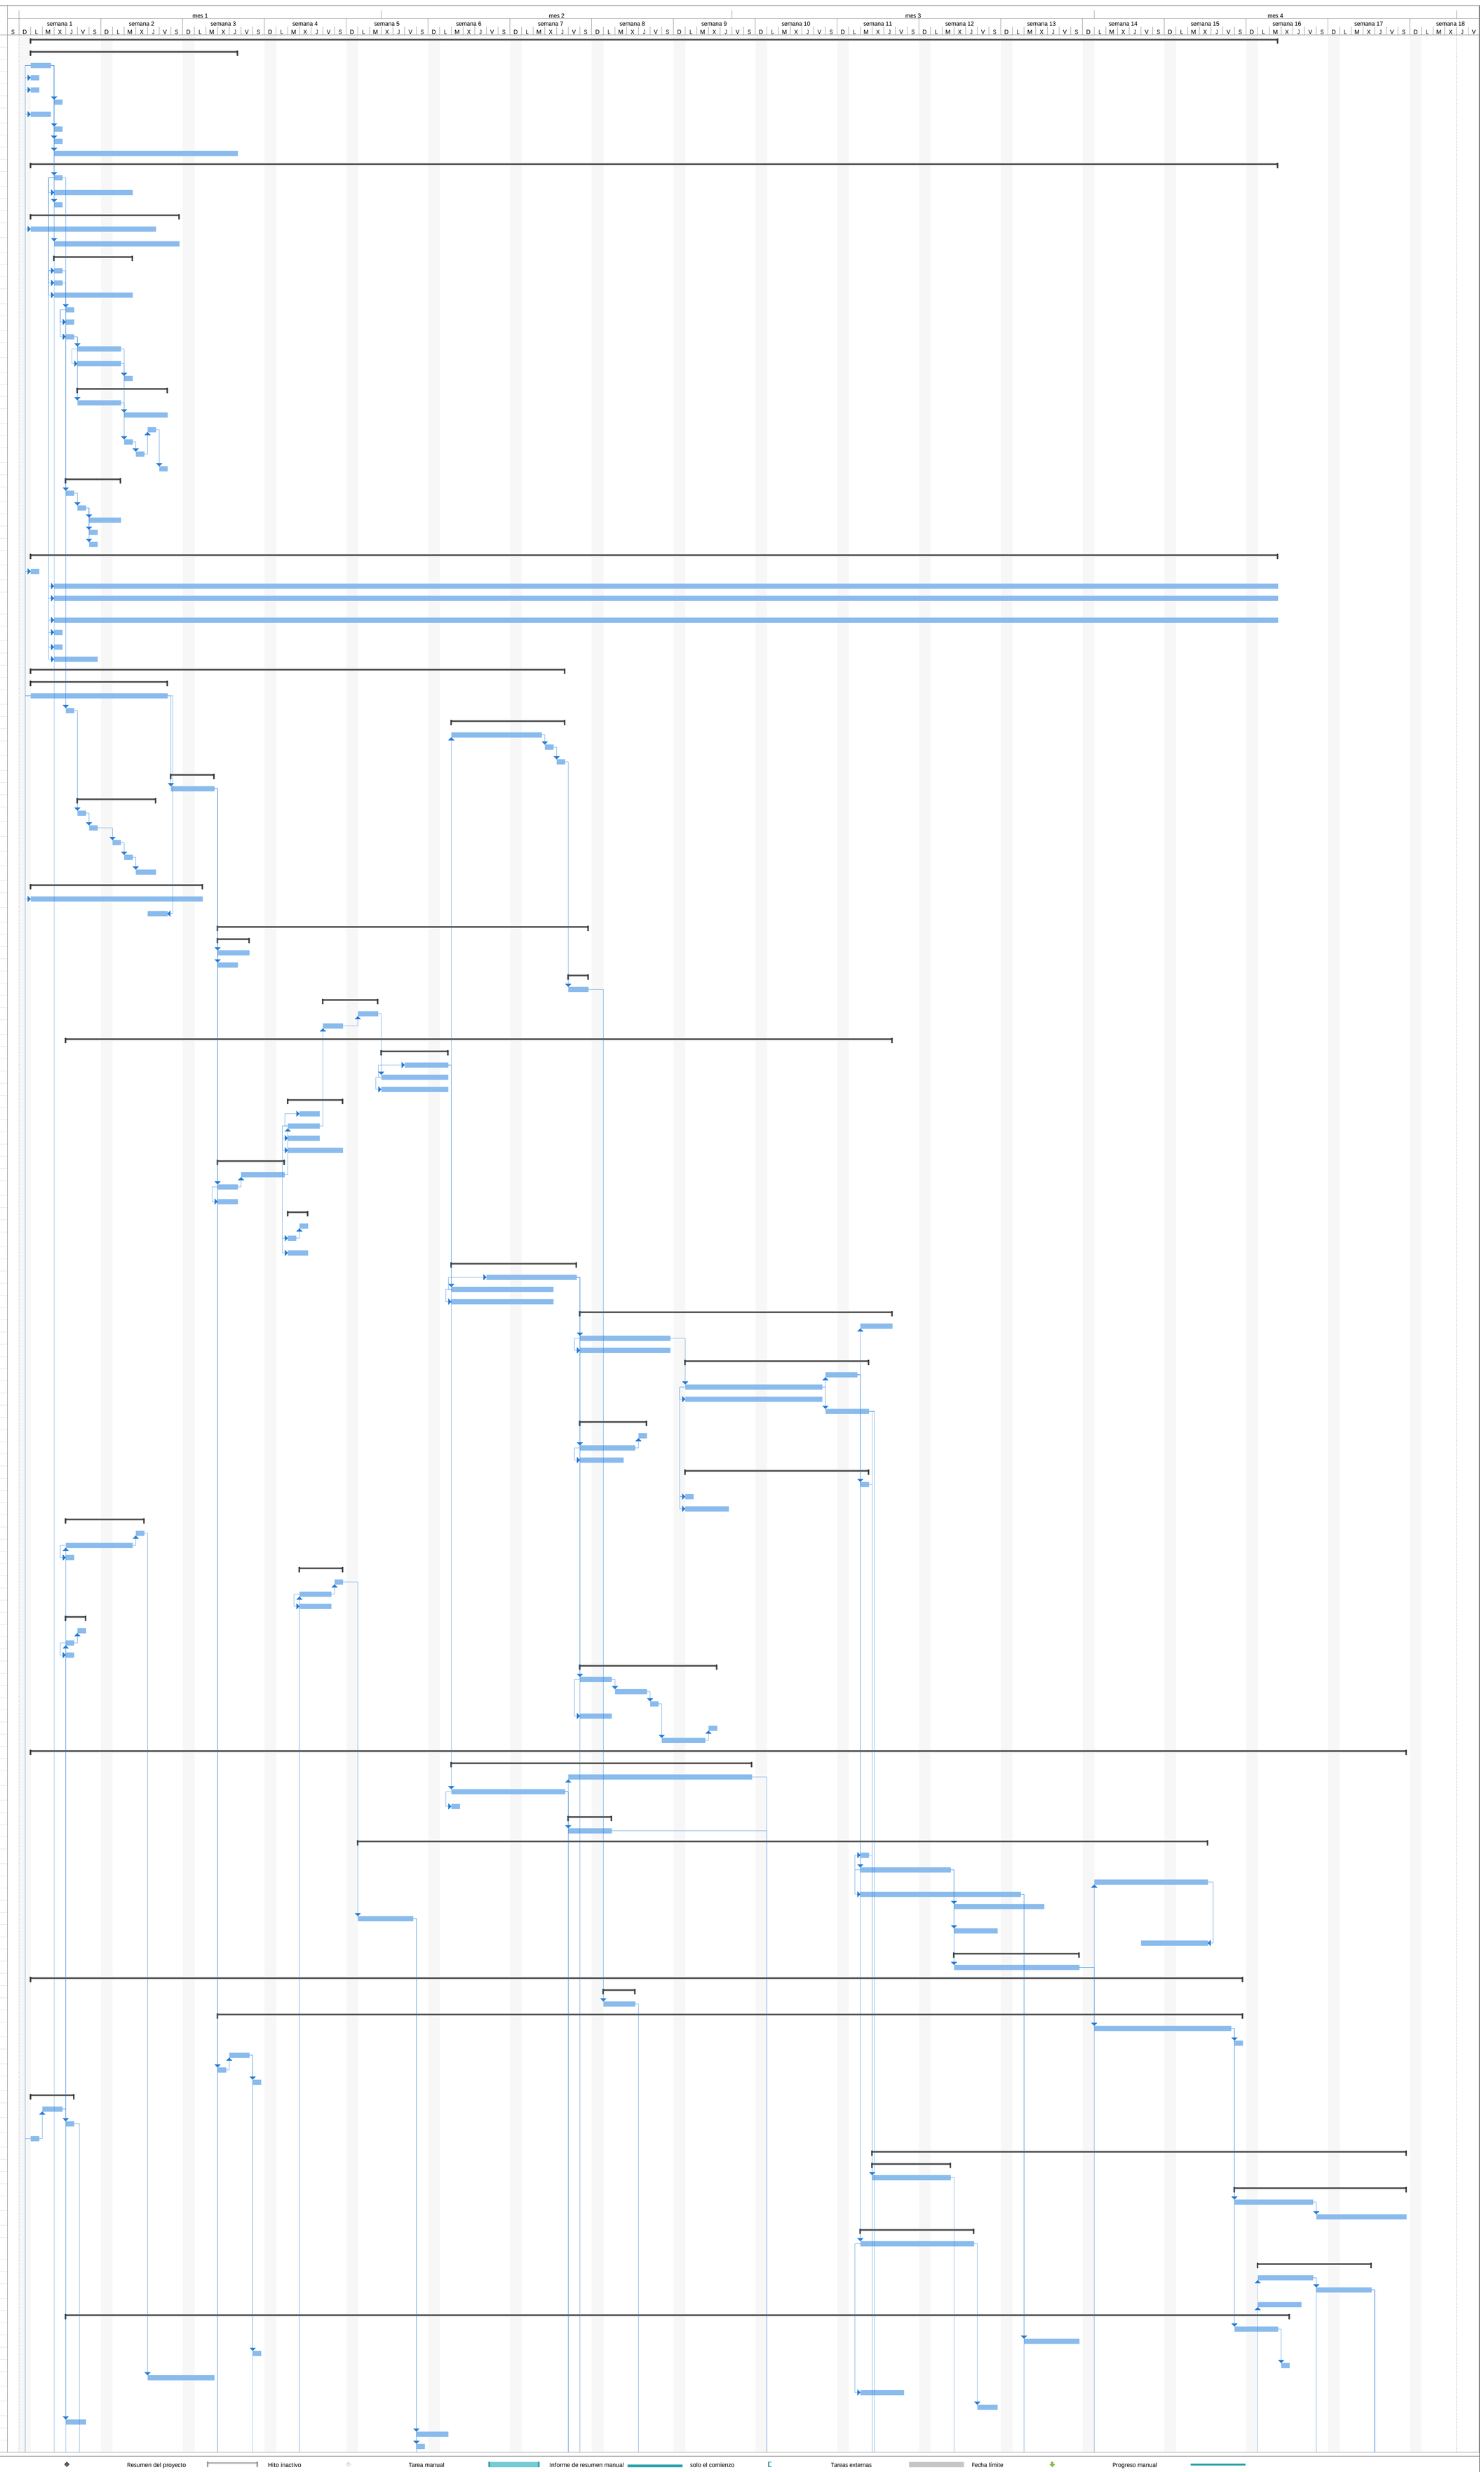

Proyecto: CRONOGRAMA GAN
Fecha: lun 28/02/22

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración
189	PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA	1 día
190	TUBOS METÁLICOS EN CERCO PERIMÉTRICO	4 días
191	CERCO METÁLICO C/TUB. RED. 2", ANG. 1" Y MALLA 2"X2"#12	1 día
192	VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS	10 días
193	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS Y PROTECTOR DE SEGURIDAD	10 días
194	CERRAJERIA	71 días
195	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS	5 días
196	BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS	1 día
197	CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS	2 días
198	CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA	1 día
199	CANDADO DE 60mm	1 día
200	PINTURA	25 días
201	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS	9 días
202	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS	3 días
203	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA	1 día
204	PINTURA EN PUERTAS DE MADERA	3 días
205	JUNTAS	15 días
206	JUNTA DE DILATACION EN PISOS CON TECNOPORT DE e= 3/8" RELLENO CON POLIURETANO	1 día
207	JUNTAS ASFALTICAS e=1"	1 día
208	VARIOS	90 días
209	CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	2 días
210	SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKER PARA SEÑALITICA DE SEGURIDAD	1 día
211	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO	1 día
212	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	5 días
213	INSTALACIONES SANITARIAS	91 días
214	MOVIMIENTO DE TIERRAS	23 días
215	EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm	1 día
216	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL H<=3.00m	5 días
217	RELLENO C/ARENA HASTA e=0.20m LA CLAVE PARA TUBO DE 160 Y 200 mm	4 días
218	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m	4 días
219	REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm	2 días
220	CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm	2 días
221	SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR	46 días
222	TUBERIA PVC-SAP 2" CLASE 10	1 día
223	TUBERIA PVC-SAP 1" CLASE 10	1 día
224	TUBERIA PVC-SAP 3/4" CLASE 10	1 día
225	VALVULA TIPO BOLA 1 1/2"	1 día
226	CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS	1 día
227	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO (2,500L)	1 día
228	SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR	4 días
229	TUBERIA DE PVC SAL 4"	1 día
230	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-20	1 día
231	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	4 días
232	CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	1 día
233	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR	1 día
234	PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO	2 días
235	PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO	2 días
236	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	51 días
237	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS	3 días
238	URINARIOS DE LOZA DE PICO	1 día
239	LAVATORIO DE LOZA BLANCA	1 día
240	LAVATORIO CORRIDO SEGUN DISEÑO REV.C/CERÁMICA 30X30	1 día
241	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1 día
242	PAPELERA DE CERAMICA	1 día
243	TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20	1 día
244	ESPEJO BISELADO	1 día
245	PAPELERA PLASTICA	1 día
246	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	1 día
247	MESA CORRIDA DE CONCRETO REVEST. C/CERÁMICO	2 días
248	INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE	8 días
249	SALIDA DE DESAGUE EN PVC	5 días
250	SALIDA PARA VENTILACION	3 días
251	TUBERIA PVC-SAL 2"	3 días
252	TUBERIA PVC-SAL 4"	2 días
253	REGISTROS DE BRONCE DE 4"	2 días
254	REGISTROS DE BRONCE DE 2"	1 día
255	PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE	1 día
256	INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA	9 días
257	SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC	5 días
258	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA	1 día
259	TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA	1 día
260	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	1 día
261	CAJA DE MADERA PARA VALVULA	1 día
262	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA	1 día
263	TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO	39 días
264	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3"	1 día
265	TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10	1 día
266	TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10	1 día
267	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2"	1 día
268	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	1 día
269	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA	1 día
270	VALVULA CHECK 2"	1 día
271	VALVULA CHECK 1 1/2"	1 día
272	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"	1 día
273	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"	1 día
274	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	1 día
275	VALVULA FLOTADORA 1 1/2"	1 día
276	VALVULA FLOTADORA 3/4"	1 día
277	CAJA BAYPAS DE CONCRETO	1 día
278	CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA	1 día
279	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	1 día
280	TAPA DE FIERRO EN CISTERNA	1 día
281	REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN. 2"	1 día
282	REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA 4"	1 día
283	ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO	1 día
284	ROMPE AGUA	1 día
285	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	43 días
286	TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm	2 días
287	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 200mm ISO 4435 S-20	1 día
288	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 18" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	1 día
289	RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES	1 día
290	EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA	1 día
291	INSTALACIONES ELECTRICAS	98 días
292	MOVIMIENTO DE TIERRAS	52 días
293	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO DE 100 x 100 cm	4 días
294	REFINE, NIVELACION DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 100 CM	1 día
295	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 100 x 100 cm	4 días
296	CONDUCTORES, DUCTOS Y ACCESORIOS	44 días
297	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm2 N2XOH BLANCO	1 día
298	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 VERDE	2 días
299	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 BLANCO	4 días
300	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 NEGRO	4 días
301	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 BLANCO	1 día
302	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 NEGRO	1 día
303	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 VERDE	1 día
304	CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm2 NH-80 VERDE	1 día
305	CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 35mm2	1 día
306	TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	4 días
307	TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	1 día
308	TUBERIA PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	1 día
309	CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150	1 día
310	SISTEMA DE TUBERIA CONDUIT EMT INC. ACCESORIOS	5 días
311	ARTEFACTOS DE ILUMINACION - LUMINARIAS / TOMACORRIENTES	40 días
312	SmartLED Office W60L60 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 4 LAMPARAS	3 días
313	SmartLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 2 LAMPARAS	2 días
314	INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMÉTICA) 2 LAMPARA	2 días
315	BERYL ADOSADA LED 15W	1 día
316	LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LEDS	1 día
317	Reflector Josfel Hall Ligth Led 250W asimétrico o EQUIVALENTE	2 días
318	DICROICO PARA PISO	2 días
319	CAJA OCTOGONAL F°G° DE 100mm x 55mm	2 días
320	INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR	1 día
321	INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR	1 día
322	INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR	1 día
323	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	1 día
324	TOMACORRIENTE DOBLE C/T	1 día
325	CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm	1 día
326	TIMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR	1 día
327	TABLERO ELECTRICO TRIFASICO/ MONOFASICO	2 días
328	TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 8 POLOS	1 día
329	TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 18 POLOS	1 día
330	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS	1 día
331	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 15A	1 día
332	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 35A	1 día
333	INTERRUPTORES DIFERENCIALES	1 día
334	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20 A/30mm A	1 día
335	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A/30mm A	1 día
336	CIRCUITOS DE MANDO DE ILUMINACION DE PATIOS	1 día
337	PULSADOR LUMINOSO NA 220V IP66	1 día
338	CONTACTOR TRIFASICO 25A	1 día
339	PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL	4 días
340	POZO CONEXION A TIERRA	4 días
341	BUZON ELECTRICO	1 día
342	BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8	1 día
343	ELECTROBOMBA	1 día
344	TABLERO DE ELECTROBOMBAS	1 día
345	TRANSPORTE DE MATERIALES	1 día
346	TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALES)	1 día
347	COMUNICACIONES	2 días
348	TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	1 día
349	CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150	1 día
350	CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm	1 día
351	CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE	4 días
352	CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE (incluye todas las gestiones necesarias)	4 días
353	CONTINGENCIA	10 días
354	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	15 días

Proyecto: CRONOGRAMA GAN
Fecha: lun 28/02/22

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
