Id	Nombre de tarea	Duración
1	**ESTRUCTURAS**	**92 días**
2	**OBRAS PROVISIONALES**	**16 días**
3	ALMACÉN, OFICINAS	2 días
4	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m	1 día
5	CERCO PROVISIONAL DE OBRA	1 día
6	SERVICIOS HIGIÉNICOS	1 día
7	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	2 días
8	SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA	1 día
9	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1 día
10	SEÑALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD	14 días
11	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**92 días**
12	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA	1 día
13	LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA	6 días
14	MOVILIZACION DE EQUIPO	1 día
15	**MITIGACION AMBIENTAL**	**12 días**
16	RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS	10 días
17	PREVENCION DE DAÑOS - DERRAME DE COMBUSTIBLES	10 días
18	**DESMONTAJES**	**6 días**
19	DESMONTAJE DE VENTANAS	1 día
20	DESMONTAJE DE PUERTAS	1 día
21	DESMONTAJE DE MATERIAL PREFABRICADO (DRYWALL)	6 días
22	DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE	1 día
23	DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO Y SOPORTE METÁLICO	1 día
24	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	1 día
25	DESMONTAJE DE COBERTURAS DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO (INC. LA ESTRUCTURA DE SOPORTE)	3 días
26	DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	3 días
27	DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL	1 día
28	**DEMOLICIÓN , REMOCION Y RASQUETEO**	**7 días**
29	DEMOLICIÓN DE PISO INC. C.P.- F.P.	3 días
30	DEMOLICIÓN DE VEREDAS, PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES	4 días
31	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO	1 día
32	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO	1 día
33	DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK (SOGA Y DE CANTO)	1 día
34	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO	1 día
35	**DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO**	**4 días**
36	DESMONTAJE DE CENTROS DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES)	1 día
37	DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	1 día
38	DESMONTAJE DE CABLE DE CENTRO DE LUZ	2 días
39	DESMONTAJE DE CABLE PARA TOMACORRIENTES	1 día
40	DESMONTAJE DE TABLEROS	1 día
41	**PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19, PARA EL TRABAJO**	**92 días**
42	ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID 19	1 día
43	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTRO DE TRABAJO	90 días
44	EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO E INCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO	90 días
45	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIA	90 días
46	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO	1 día
47	MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA	1 día
48	MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL	4 días
49	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**40 días**
50	**CORTE Y EXCAVACION**	**11 días**
51	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMIENTOS CORRIDOS , PLATEAS Y ZAPATAS)	11 días
52	CORTE DE MATERIAL SUELTO R=150 m3/dia (EQUIP	1 día
53	**RELLENO**	**9 días**
54	RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPI	7 días
55	RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO PREPARADO)	1 día
56	RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON)	1 día
57	**CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE**	**3 días**
58	NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION	3 días
59	**MEJORAMIENTO DE TERRENO**	**6 días**
60	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=50cm (COLOCACION DE OVER DE 1" A 6" - CON EQUIPO)	1 día
61	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=50cm (COLOCACION DE HORMIGON - CON EQUIPO)	1 día
62	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=30cm (COLOCACION DE HORMIGÓN - CON EQUIPO)	1 día
63	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)	1 día
64	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=10cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)	2 días
65	**ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL**	**13 días**
66	ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=30m)	13 días
67	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km)	2 días
68	**CONCRETO SIMPLE**	**28 días**
69	**SOLADO**	**3 días**
70	SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=2", 1:12 C/H	3 días
71	SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H	2 días
72	**FALSO PISO**	**2 días**
73	FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"	2 días
74	**CIMIENTOS**	**4 días**
75	CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2	2 días
76	CIMIENTOS CORRIDOS; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	2 días
77	**CONCRETO ARMADO**	**61 días**
78	**SOBRECIMIENTO**	**5 días**
79	SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2	3 días
80	SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	5 días
81	SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2	5 días
82	**ZAPATAS**	**5 días**
83	ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2	2 días
84	ZAPATAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días
85	ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	3 días
86	ZAPATAS.- ENTIBADO H=1.5-2.2m	5 días
87	**PLATEA DE CIMENTACIÓN**	**5 días**
88	PLATEA DE CIMENTACION.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2	3 días
89	PLATEA DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	2 días
90	PLATEA DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2	2 días
91	**VIGAS DE CIMENTACION**	**2 días**
92	VIGAS DE CIMENTACION.- CONCRETO fc=210kg/cm2	1 día
93	VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1 día
94	VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2	2 días
95	**COLUMNA**	**10 días**
96	COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM2	7 días
97	COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	8 días
98	COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	8 días
99	**VIGAS**	**23 días**
100	VIGAS - CONCRETO 210Kg/cm2	3 días
101	VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	7 días
102	VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	7 días
103	**LOSAS ALIGERADAS**	**14 días**
104	LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2	2 días
105	LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	11 días
106	LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2	11 días
107	LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30	3 días
108	**ESCALERAS**	**5 días**
109	ESCALERAS.- CONCRETO fc=210 kg/cm2	1 día
110	ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	4 días
111	ESCALERAS.- ACERO fy=4200 kg/cm2	3 días
112	**LOSA MACISA**	**14 días**
113	LOSA MACISA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2	1 día
114	LOSA MACISA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1 día
115	LOSA MACISA.-ACERO fy=4200 kg/cm2	4 días
116	**CUNETAS CON REJILLA**	**6 días**
117	CUNETAS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2	1 día
118	CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	5 días
119	CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	1 día
120	**CISTERNA**	**4 días**
121	CISTERNA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2	1 día
122	CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días
123	CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2	3 días
124	**TANQUE ELEVADO**	**2 días**
125	TANQUE ELEVADO.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2	1 día
126	TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1 día
127	TANQUE ELEVADO.-ACERO fy=4200 kg/cm2	1 día
128	**ESTRUCTURAS METALICAS**	**10 días**
129	TIJERAL T-1(HABILITACION Y MONTAJE)	2 días
130	VIGUETA METALICA VG1 (HABILITACIÓN Y MONTAJE)	3 días
131	TEMPLADOR Y CRUZ DE SAN ANDRES	1 día
132	APOYOS METALICOS FIJO Y MOVIL	2 días
133	CANALETA FG 1.6MM	1 día
134	COBERTURA LIVIANA	3 días
135	**ARQUITECTURA**	**102 días**
136	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**	**23 días**
137	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1:4 e=1.5cm	14 días
138	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M : 1:1:4 e=1.5cm	9 días
139	FIERRO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS	1 día
140	**TABIQUERIA MOVIL**	**3 días**
141	MURO DE DRYWALL DOBLE ESTRUCTURA e= 1.5cm	3 días
142	**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS**	**63 días**
143	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5	1 día
144	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES	7 días
145	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES	9 días
146	TARRAJEO DE COLUMNAS	12 días
147	TARRAJEO DE VIGAS	7 días
148	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	5 días
149	VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)	4 días
150	BRUÑAS SEGÚN DETALLE	5 días
151	**CIELORRASOS**	**10 días**
152	CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5	10 días
153	**PISOS Y PAVIMENTOS**	**90 días**
154	**CONTRAPISOS**	**3 días**
155	CONTRAPISO DE 40 mm	3 días
156	**PISOS**	**76 días**
157	PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DOMINE MATE BLANCO- ALTO TRANSITO	11 días
158	PISO CERAMICO 45 x 45 ALTO TRÁNSITO	1 día
159	PISO DE CONCRETO EN PATIOS f'c=175kg/cm2; e=15cm FROTACHADO	2 días
160	PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1 día
161	PISO DE GOMA ECOLOGICO DE CAUCHO SUMINISTRO E INSTALACION	1 día
162	**VEREDAS Y RAMPAS**	**4 días**
163	VEREDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	2 días
164	RAMPAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	1 día
165	VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRAD	1 día
166	**ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS**	**40 días**
167	**ZOCALOS**	**6 días**
168	ZOCALO CERAMICO 45X45	6 días

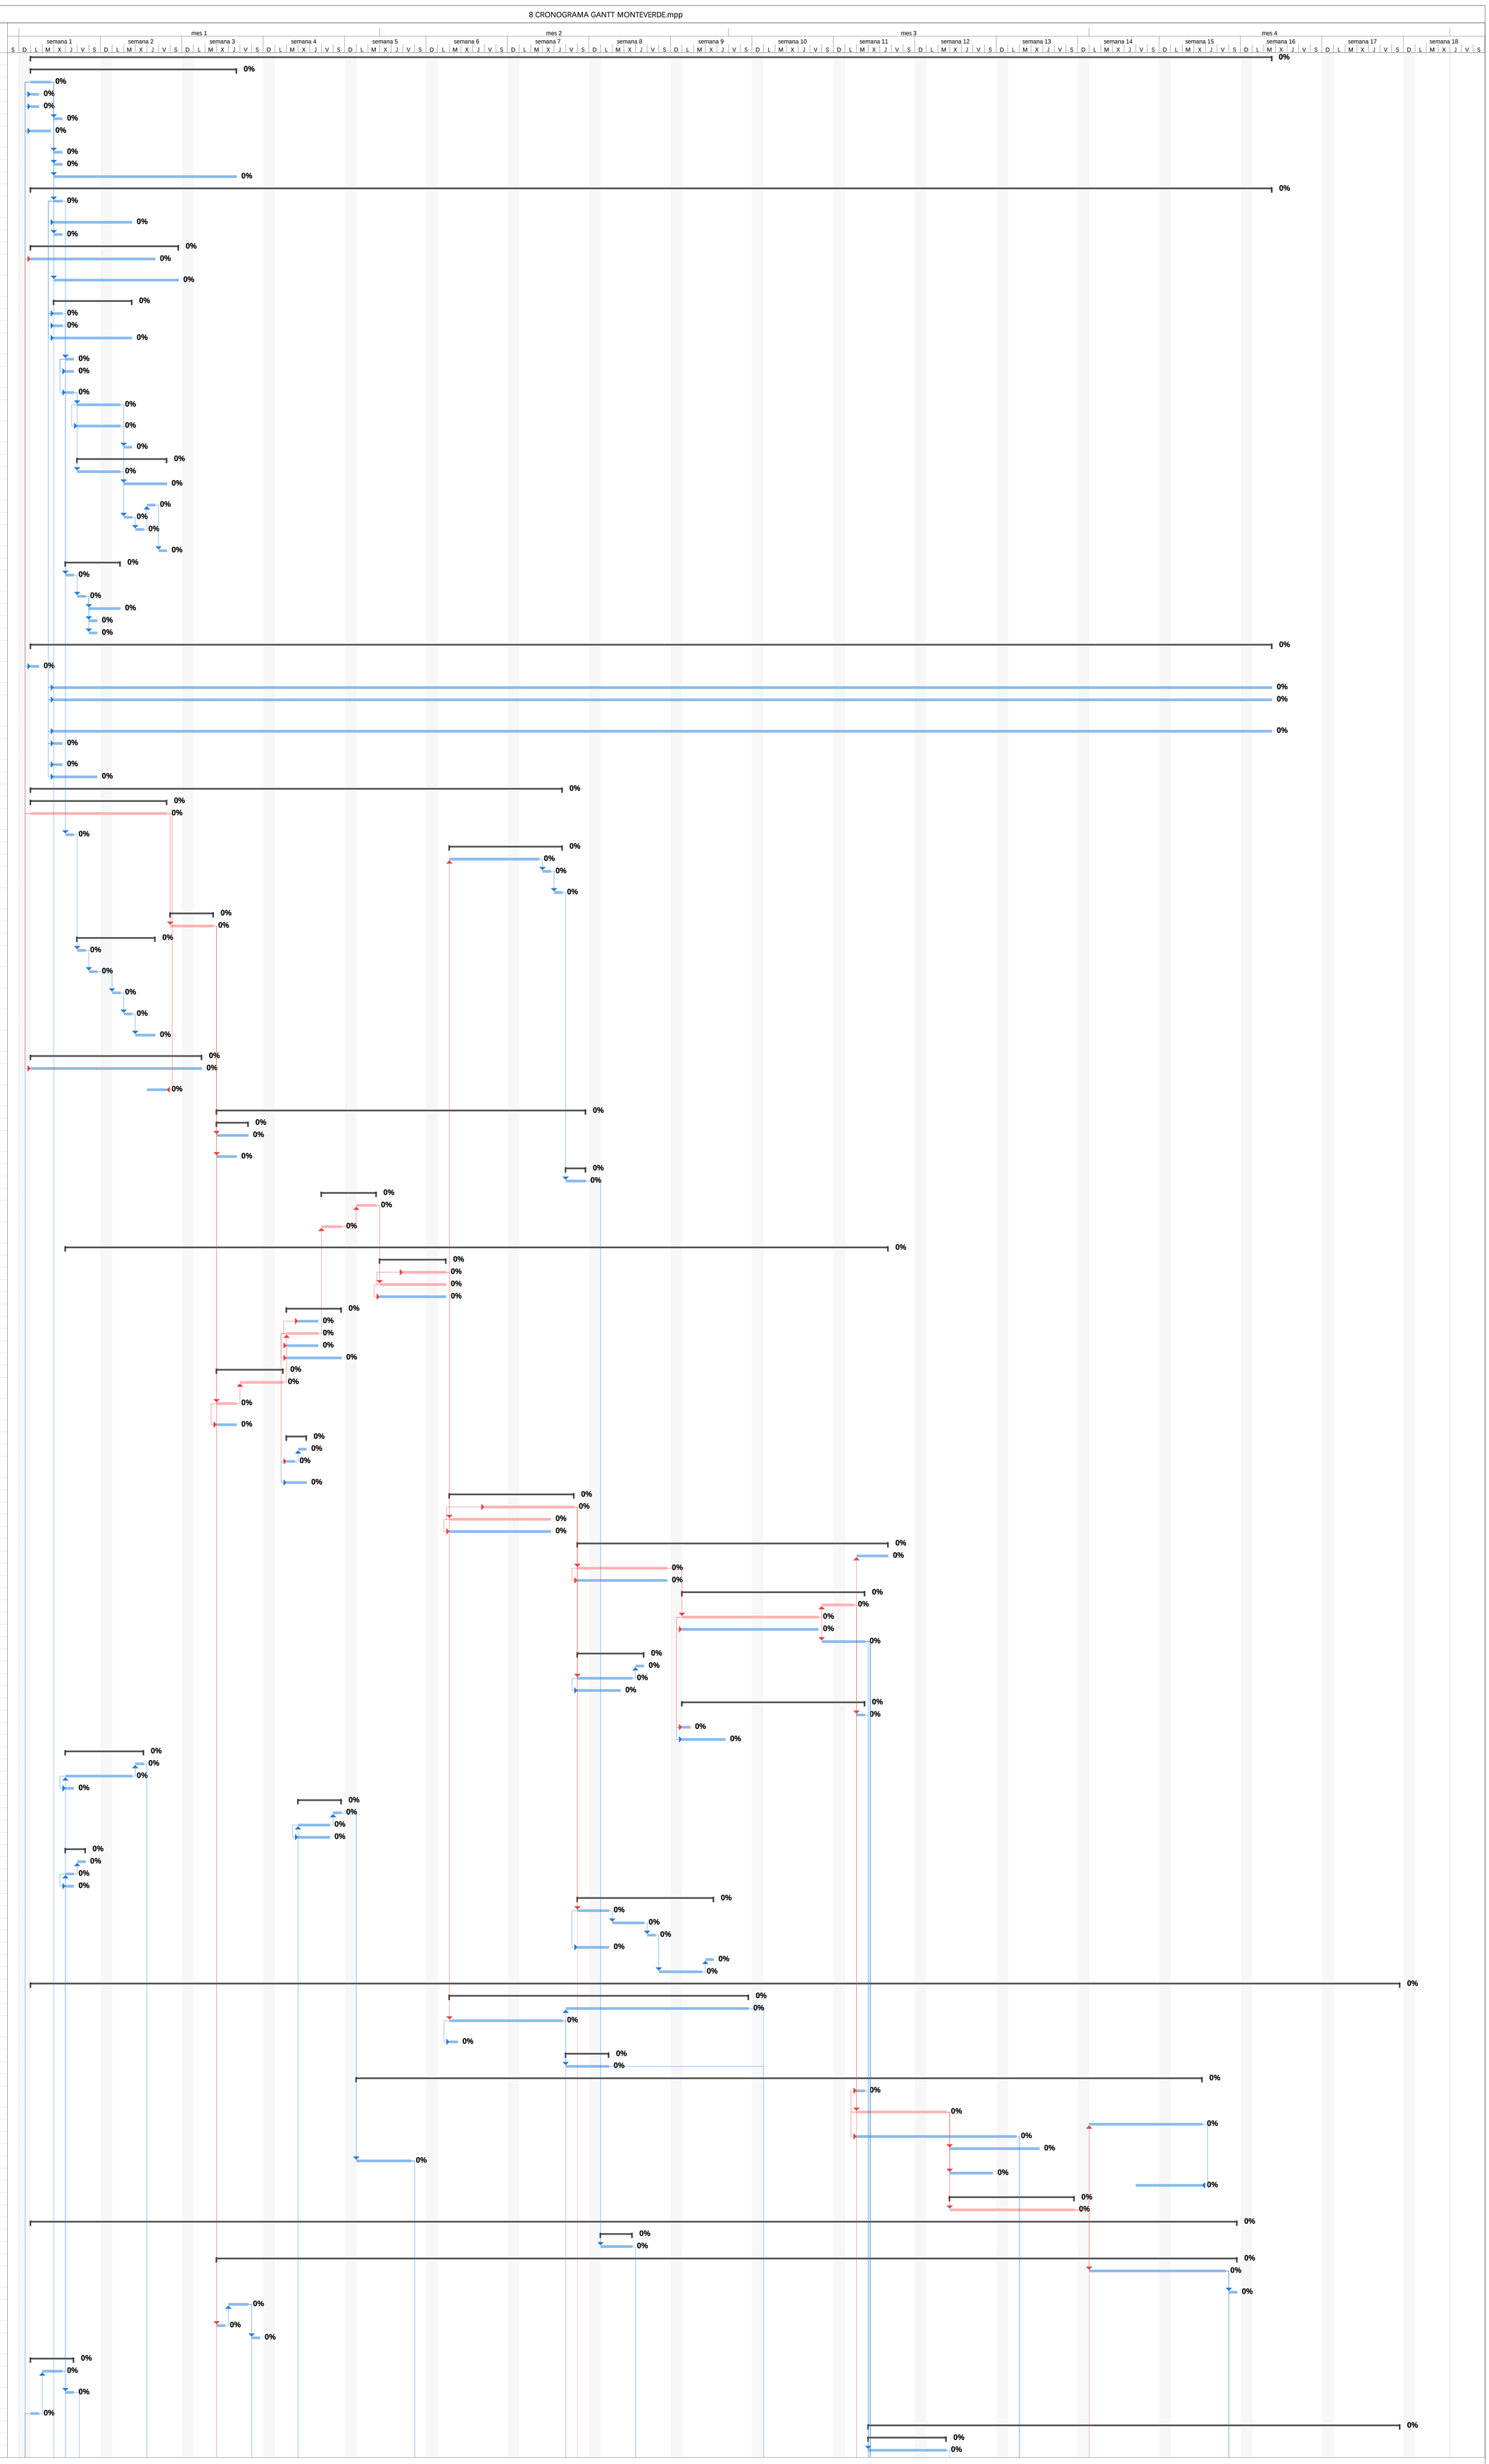

Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · solo el comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite

Id	Nombre de tarea	Duración
169	**CONTRAZOCALOS**	**13 días**
170	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 20X60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE-ALTO TRANSITO	6 días
171	CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO	7 días
172	**COBERTURAS**	**9 días**
173	COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)	9 días
174	**CARPINTERIA DE MADERA**	**9 días**
175	PUERTA MACHIEMBRADA	5 días
176	PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4"	4 días
177	PIZARRA ACRILICA	4 días
178	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA**	**90 días**
179	CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA	3 días
180	PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES	5 días
181	ASTA DE BANDERA	1 día
182	BARANDA METALICA EN ESCALERA	1 día
183	REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)	5 días
184	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCUENTRO METALICO ENTRE SOBRETECHO Y PARAPETO	4 días
185	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm	2 días
186	BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS	2 días
187	ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO	2 días
188	ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA	1 día
189	PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA	1 día
190	TUBOS METÁLICOS EN CERCO PERIMÉTRICO	4 días
191	CERCO METÁLICO C/TUB. RED. 2", ANG. 1" Y MALLA 2"X2"#12	1 día
192	**VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS**	**10 días**
193	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS Y PROTECTOR DE SEGURIDAD	10 días
194	**CERRAJERIA**	**71 días**
195	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS	5 días
196	BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS	1 día
197	CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS	2 días
198	CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA	1 día
199	CANDADO DE 60mm	1 día
200	**PINTURA**	**25 días**
201	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS	9 días
202	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS	3 días
203	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA	1 día
204	PINTURA EN PUERTAS DE MADERA	3 días
205	**JUNTAS**	**15 días**
206	JUNTA DE DILATACION EN PISOS CON TECNOPORT DE e= 3/8" RELLENO CON POLIURETANO	1 día
207	JUNTAS ASFALTICAS e=1"	1 día
208	**VARIOS**	**90 días**
209	CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	2 días
210	SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKER PARA SEÑALITICA DE SEGURIDAD	1 día
211	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO	1 día
212	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	5 días
213	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**91 días**
214	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**23 días**
215	EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm	1 día
216	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL H<=3.00m	5 días
217	RELLENO C/ARENA HASTA e=0.20m LA CLAVE PARA TUBO DE 160 Y 200 mm	4 días
218	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m	4 días
219	REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm	2 días
220	CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm	2 días
221	**SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR**	**46 días**
222	TUBERIA PVC-SAP 2" CLASE 10	1 día
223	TUBERIA PVC-SAP 1" CLASE 10	1 día
224	TUBERIA PVC-SAP 3/4" CLASE 10	1 día
225	VALVULA TIPO BOLA 1 1/2"	1 día
226	CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS	1 día
227	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO (2,500L)	1 día
228	**SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR**	**4 días**
229	TUBERIA DE PVC SAL 4"	1 día
230	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-20	1 día
231	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	4 días
232	CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	1 día
233	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR	1 día
234	**PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO**	**2 días**
235	PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO	2 días
236	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**51 días**
237	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS	3 días
238	URINARIOS DE LOZA DE PICO	1 día
239	LAVATORIO DE LOZA BLANCA	1 día
240	LAVATORIO CORRIDO SEGUN DISEÑO REV.C/CERÁMICA 30X30	1 día
241	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1 día
242	PAPELERA DE CERAMICA	1 día
243	TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20	1 día
244	ESPEJO BISELADO	1 día
245	PAPELERA PLASTICA	1 día
246	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	1 día
247	MESA CORRIDA DE CONCRETO REVEST. C/CERÁMICO	2 días
248	**INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE**	**8 días**
249	SALIDA DE DESAGUE EN PVC	5 días
250	SALIDA PARA VENTILACION	3 días
251	TUBERIA PVC-SAL 2"	3 días
252	TUBERIA PVC-SAL 4"	2 días
253	REGISTROS DE BRONCE DE 4"	2 días
254	REGISTROS DE BRONCE DE 2"	1 día
255	PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE	1 día
256	**INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA**	**9 días**
257	SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC	5 días
258	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA	1 día
259	TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA	1 día
260	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	1 día
261	CAJA DE MADERA PARA VALVULA	1 día
262	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA	1 día
263	**TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO**	**39 días**
264	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3"	1 día
265	TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10	1 día
266	TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10	1 día
267	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2"	1 día
268	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	1 día
269	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA	1 día
270	VALVULA CHECK 2"	1 día
271	VALVULA CHECK 1 1/2"	1 día
272	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"	1 día
273	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"	1 día
274	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	1 día
275	VALVULA FLOTADORA 1 1/2"	1 día
276	VALVULA FLOTADORA 3/4"	1 día
277	CAJA BAYPAS DE CONCRETO	1 día
278	CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA	1 día
279	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	1 día
280	TAPA DE FIERRO EN CISTERNA	1 día
281	REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN. 2"	1 día
282	REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA 4"	1 día
283	ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO	1 día
284	ROMPE AGUA	1 día
285	**SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL**	**43 días**
286	TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm	2 días
287	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 200mm ISO 4435 S-20	1 día
288	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 18" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	1 día
289	**RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES**	**1 día**
290	EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA	1 día
291	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**98 días**
292	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**52 días**
293	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO DE 100 x 100 cm	4 días
294	REFINE, NIVELACION DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 100 CM	1 día
295	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 100 x 100 cm	4 días
296	**CONDUCTORES, DUCTOS Y ACCESORIOS**	**44 días**
297	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm2 N2XOH BLANCO	1 día
298	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 VERDE	2 días
299	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 BLANCO	4 días
300	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 NEGRO	4 días
301	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 BLANCO	1 día
302	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 NEGRO	1 día
303	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 VERDE	1 día
304	CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm2 NH-80 VERDE	1 día
305	CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 35mm2	1 día
306	TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	4 días
307	TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	1 día
308	TUBERIA PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	1 día
309	CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150	1 día
310	SISTEMA DE TUBERIA CONDUIT EMT INC. ACCESORIOS	5 días
311	**ARTEFACTOS DE ILUMINACION - LUMINARIAS / TOMACORRIENTES**	**40 días**
312	SmartLED Office W60L60 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 4 LAMPARAS	3 días
313	SmartLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 2 LAMPARAS	2 días
314	INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMÉTICA) 2 LAMPARA	2 días
315	BERYL ADOSADA LED 15W	1 día
316	LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LEDS	1 día
317	Reflector Josfel Hall Ligth Led 250W asimétrico o EQUIVALENTE	2 días
318	DICROICO PARA PISO	2 días
319	CAJA OCTOGONAL F°G° DE 100mm x 55mm	2 días
320	INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR	1 día
321	INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR	1 día
322	INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR	1 día
323	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	1 día
324	TOMACORRIENTE DOBLE C/T	1 día
325	CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm	1 día
326	TIMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR	1 día
327	**TABLERO ELECTRICO TRIFASICO/ MONOFASICO**	**2 días**
328	TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 8 POLOS	1 día
329	TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 18 POLOS	1 día
330	**INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS**	**1 día**
331	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 15A	1 día
332	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 35A	1 día

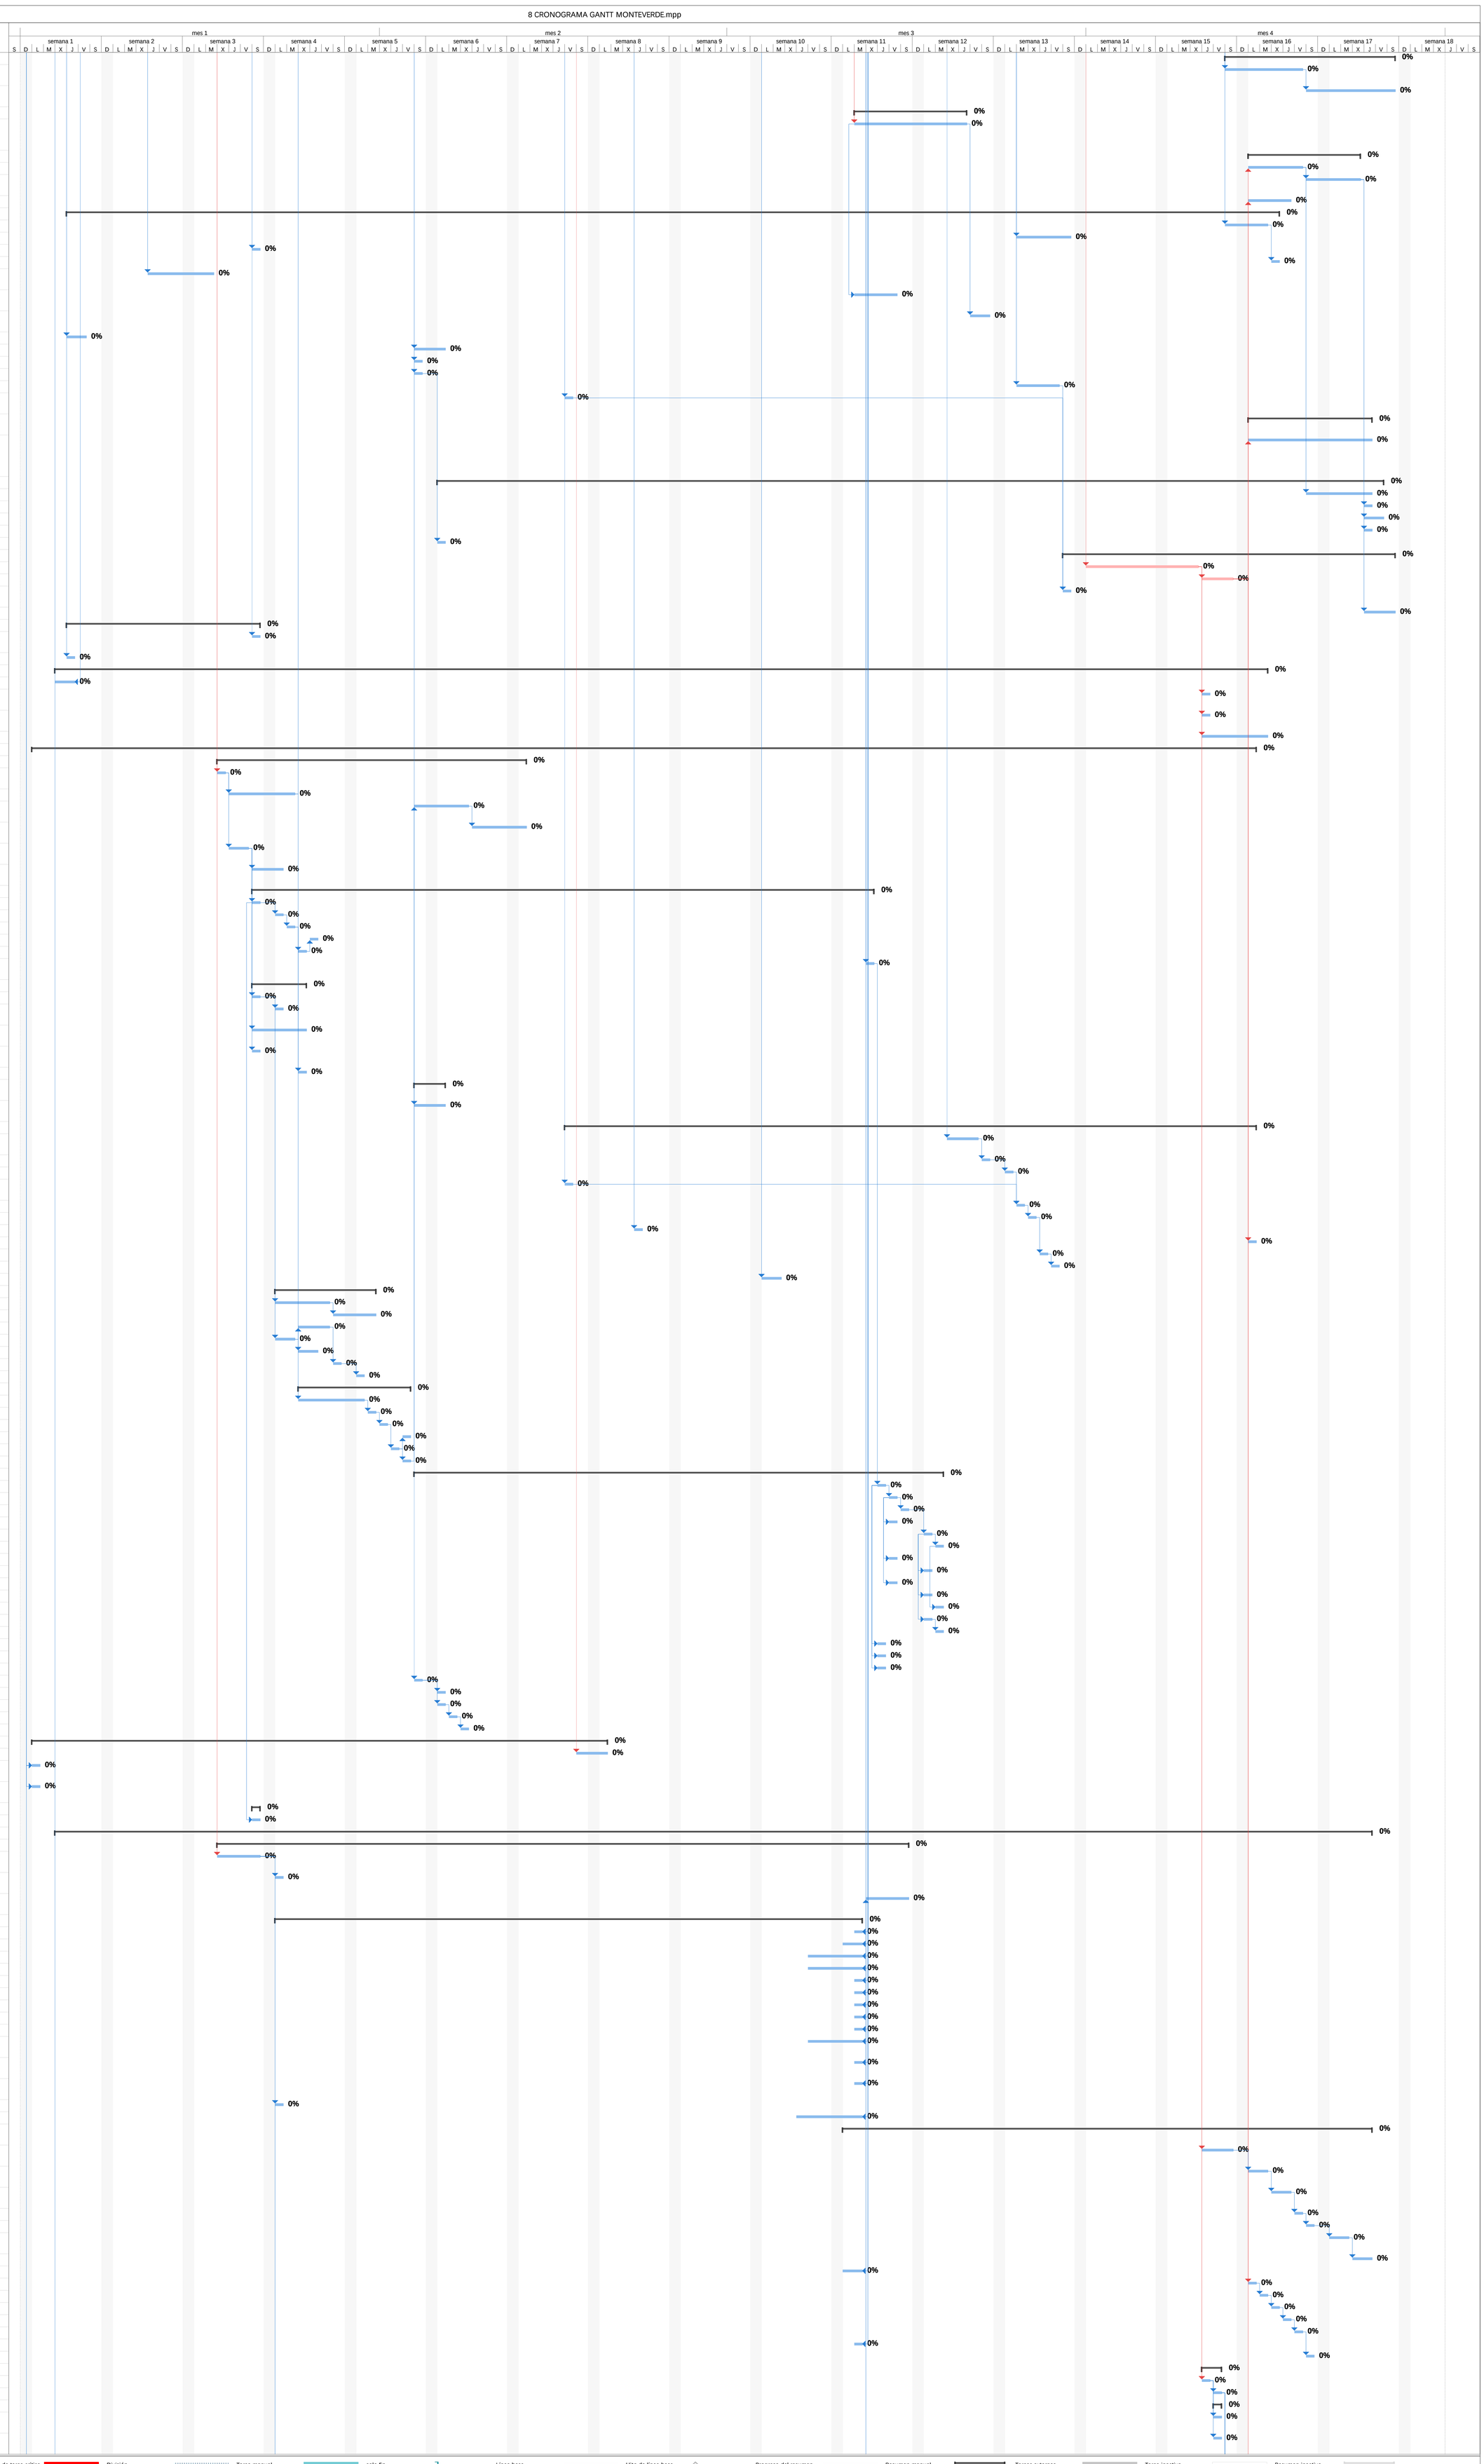

Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · solo el comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite

Id	Nombre de tarea	Duración
333	**INTERRUPTORES DIFERENCIALES**	**1 día**
334	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20 A/30mm A	1 día
335	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A/30mm A	1 día
336	**CIRCUITOS DE MANDO DE ILUMINACION DE PATIOS**	**1 día**
337	PULSADOR LUMINOSO NA 220V IP66	1 día
338	CONTACTOR TRIFASICO 25A	1 día
339	**PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL**	**4 días**
340	POZO CONEXION A TIERRA	4 días
341	**BUZON ELECTRICO**	**1 día**
342	BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8	1 día
343	**ELECTROBOMBA**	**1 día**
344	TABLERO DE ELECTROBOMBAS	1 día
345	**TRANSPORTE DE MATERIALES**	**1 día**
346	TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALES)	1 día
347	**COMUNICACIONES**	**2 días**
348	TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	1 día
349	CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150	1 día
350	CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm	1 día
351	**CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE**	**4 días**
352	CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE (incluye todas las gestiones necesarias)	4 días
353	CONTINGENCIA	10 días
354	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	15 días

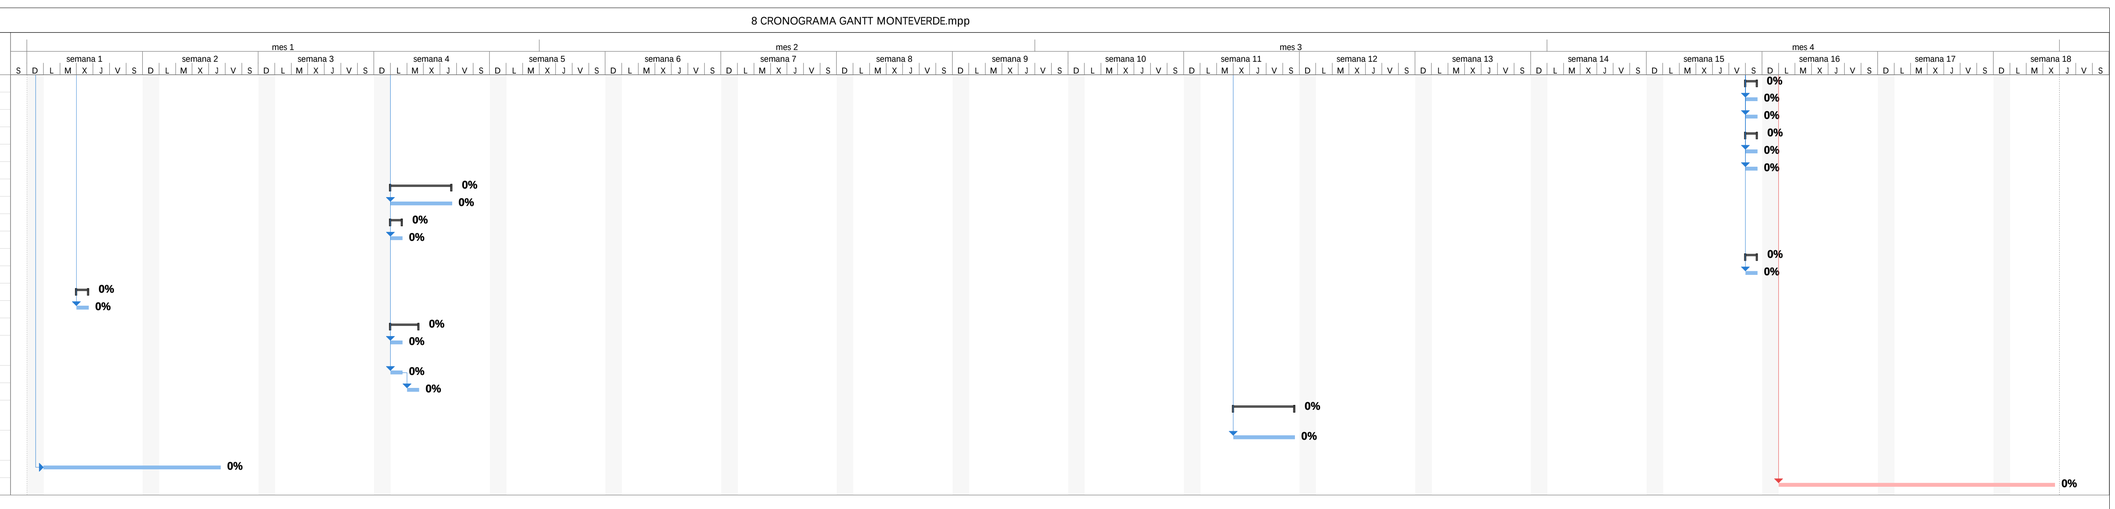

Tareas críticas · Progreso de tarea crítica · División · Tarea manual · solo fin · Línea base · Hito de línea base · Progreso del resumen · Resumen manual · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo
División crítica · Tarea · Progreso de tarea · solo el comienzo · solo duración · División de la línea base · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Fecha límite
