Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
1			
2		**ESTRUCTURAS**	**85 días**
3		**OBRAS PROVISIONALES**	**14 días**
4		ALMACÉN, OFICINAS	4 días
5		CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m	1 día
6		CERCO PROVISIONAL DE OBRA	2 días
7		SERVICIOS HIGIÉNICOS	3 días
8		ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDA	4 días
9		SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA	3 días
10		SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1 día
11		SEÑALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD	14 días
12		**TRABAJOS PRELIMINARES**	**20 días**
13		TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA	3 días
14		LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA	17 días
15		MOVILIZACION DE EQUIPO	1 día
16		**MITIGACION AMBIENTAL**	**10 días**
17		RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS	10 días
18		PREVENCION DE DAÑOS - DERRAME DE COMBUSTIBLES	10 días
19		**DESMONTAJES**	**15 días**
20		DESMONTAJE DE VENTANAS	4 días
21		DESMONTAJE DE PUERTAS	2 días
22		DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	1 día
23		DESMONTAJE DE COBERTURAS DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO (INC. LA ES	8 días
24		DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOP	7 días
25		DESMONTAJE DE TIJERALES METALICOS	1 día
26		DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL	2 días
27		DESMONTAJE DE MUROS DE DRYWALL Y TRIPLAY	6 días
28		DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO	1 día
29		**DEMOLICIÓN , REMOCION Y RASQUETEO**	**11 días**
30		DEMOLICIÓN DE PISO INC. C.P. - F.P.	5 días
31		DEMOLICIÓN DE PISO DE SS.HH (INCLUYE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE)	1 día
32		DEMOLICIÓN DE VEREDAS, PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES	4 días
33		DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK (SOGA Y DE CANTO)	5 días
34		DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONCRETO EN CISTERNA Y CASETA DE ELECTRO	2 días
35		DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO	5 días
36		DEMOLICION DE CAJAS DE DESAGUE	1 día
37		**DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO**	**4 días**
38		DESMONTAJE DE CENTROS DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES)	2 días
39		DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	1 día
40		DESMONTAJE DE TABLEROS	1 día
41		**PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19, PARA EL TRABAJO**	**6 días**
42		ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID 19	1 día
43		LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTRO DE TRABAJO	4 días
44		EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGR	1 día
45		LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIA	4 días
46		SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRAB	1 día
47		MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA	1 día
48		MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL	3 días
49		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**21 días**
50		**CORTE Y EXCAVACION**	**12 días**
51		EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMIENTOS CORRIDOS , PL	11 días
52		CORTE DE MATERIAL SUELTO R=150 m3/dia (EQUIPO)	3 días
53		**RELLENO**	**8 días**
54		RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO	5 días
55		RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO PI	3 días
56		**CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE**	**5 días**
57		NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION	5 días
58		**MEJORAMIENTO DE TERRENO**	**1 día**
59		MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=40cm (COLOCACION DE OVER D	1 día
60		**ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL**	**7 días**
61		ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=	7 días
62		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km)	2 días
63		**CONCRETO SIMPLE**	**23 días**
64		**SOLADO**	**5 días**
65		SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H	5 días
66		**FALSO PISO**	**3 días**
67		FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"	3 días
68		**CIMIENTOS**	**5 días**
69		CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2	5 días
70		**CONCRETO ARMADO**	**58 días**
71		**SOBRECIMIENTO**	**10 días**
72		SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO fc=175 kg/cm2	4 días
73		SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	10 días
74		SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2	4 días
75		**ZAPATAS**	**6 días**
76		ZAPATAS.-CONCRETO fc=210 kg/cm2	2 días
77		ZAPATAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1 día
78		ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	6 días
79		**VIGAS DE CIMENTACION**	**3 días**
80		VIGAS DE CIMENTACION.-CONCRETO fc=280 kg/cm2 - 1 PISO	1 día
81		VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días
82		VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2	2 días
83		**COLUMNA**	**23 días**
84		COLUMNAS.-CONCRETO fc=210 kg/cm2 - 1 PISO	3 días
85		COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	23 días
86		COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	13 días
87		**VIGAS**	**13 días**
88		VIGAS.-CONCRETO fc=210 kg/cm2 - 1 PISO	2 días
89		VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	13 días
90		VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	11 días
91		**LOSAS ALIGERADAS**	**22 días**
92		LOSA ALIGERADA.-CONCRETO fc=210 kg/cm2 - 1 PISO	2 días
93		LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	20 días
94		LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2	6 días
95		LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30	2 días
96		**ESCALERAS**	**5 días**
97		ESCALERAS.- CONCRETO fc=210 kg/cm2	1 día
98		ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	4 días
99		ESCALERAS.- ACERO fy=4200 kg/cm2	2 días
100		**CUNETAS CON REJILLA**	**10 días**
101		CUNETAS.-CONCRETO fc=175 kg/cm2	3 días
102		CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	10 días
103		CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	1 día
104		**CISTERNA**	**4 días**
105		CISTERNA.-CONCRETO fc=210 kg/cm2	1 día
106		CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días
107		CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2	4 días
108		**TANQUE ELEVADO**	**3 días**
109		TANQUE ELEVADO.-CONCRETO fc=210 kg/cm2	1 día
110		TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días
111		TANQUE ELEVADO.-ACERO fy=4200 kg/cm2	2 días
112		**ESTRUCTURAS METALICAS**	**17 días**
113		PORTICO METALICO PARABOLICO PT	6 días
114		VIGUETA METALICA VG1	5 días
115		TENSORES	3 días
116		TEMPLADOR Y CRUZ DE SAN ANDRES	2 días
117		ARRIOSTRE DE VIGUETAS EN CRUZ	1 día
118		APOYOS METALICOS FIJO Y MOVIL	3 días
119		CANALETA FG 1.6MM	2 días
120		COBERTURA LIVIANA CURVA	5 días
121		**ARQUITECTURA**	**61 días**
122		**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**	**30 días**
123		MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1:4 e=1.5cm	20 días
124		MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M : 1:1:4 e=1.5cm	20 días
125		FIERRO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS	2 días
126		**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS**	**51 días**
127		TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5	8 días
128		TARRAJEO EN MUROS INTERIORES	19 días
129		TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES	14 días
130		TARRAJEO DE COLUMNAS	28 días
131		TARRAJEO DE VIGAS	21 días
132		TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO	2 días
133		TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	13 días
134		VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)	7 días
135		BRUÑAS SEGÚN DETALLE	9 días
136		**CIELORRASOS**	**35 días**
137		CIELORRASO CON MEZCLA C A 1:5	35 días
138		**PISOS Y PAVIMENTOS**	**29 días**
139		**CONTRAPISOS**	**6 días**
140		CONTRAPISO DE 40 mm	6 días
141		**PISOS**	**26 días**
142		PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO	13 días
143		PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO ESMALTADO MATE GALAXY STONE-	5 días
144		PISO CERAMICO 45 x 45 MODELO CEMENTO BLANCO- ALTO TRANSITO	3 días
145		PISO CERAMICO 45 x 45 MODELO GRIS PLATA- ALTO TRANSITO	2 días
146		PISO CERAMICO 30 x 30 MODELO GRANILLA BLANCO- ALTO TRANSITO	6 días
147		PISO DE CONCRETO EN PATIOS fc=175kg/cm2; e=15cm FROTACHADO	3 días
148		PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	2 días
149		PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO e=2"	1 día
150		**SARDINELES**	**3 días**
151		SARDINEL.-CONCRETO fc=175 kg/cm2 (INC. EXCAVACION)	1 día
152		SARDINEL.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días
153		**VEREDAS Y RAMPAS**	**6 días**
154		VEREDAS e=4" DE CONCRETO fc=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BR	4 días
155		RAMPAS e=4" DE CONCRETO fc=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRU	1 día
156		VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	4 días
157		**ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS**	**13 días**
158		**ZOCALOS**	**9 días**
159		ZOCALOS DE CERAMICA 25X40 MODELO DECORADO LINEAL BLANCO	9 días
160		**CONTRAZOCALOS**	**13 días**
161		CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERL	7 días
162		CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=10 cm	5 días
163		**COBERTURAS**	**15 días**
164		COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (	12 días
165		COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO	15 días
166		IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA	6 días
167		COBERTURA CON PLANCHAS DE POLICARBONATO (INC. ESTRUCTURA DE SOF	5 días
168		CARPINTERIA DE MADERA	30 días
169		CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA	15 días
170		VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS	20 días
171		CERRAJERIA	6 días
172		PINTURA	35 días
173		JUNTAS	6 días
174		JUEGOS INFANTILES	3 días
175		VARIOS	4 días

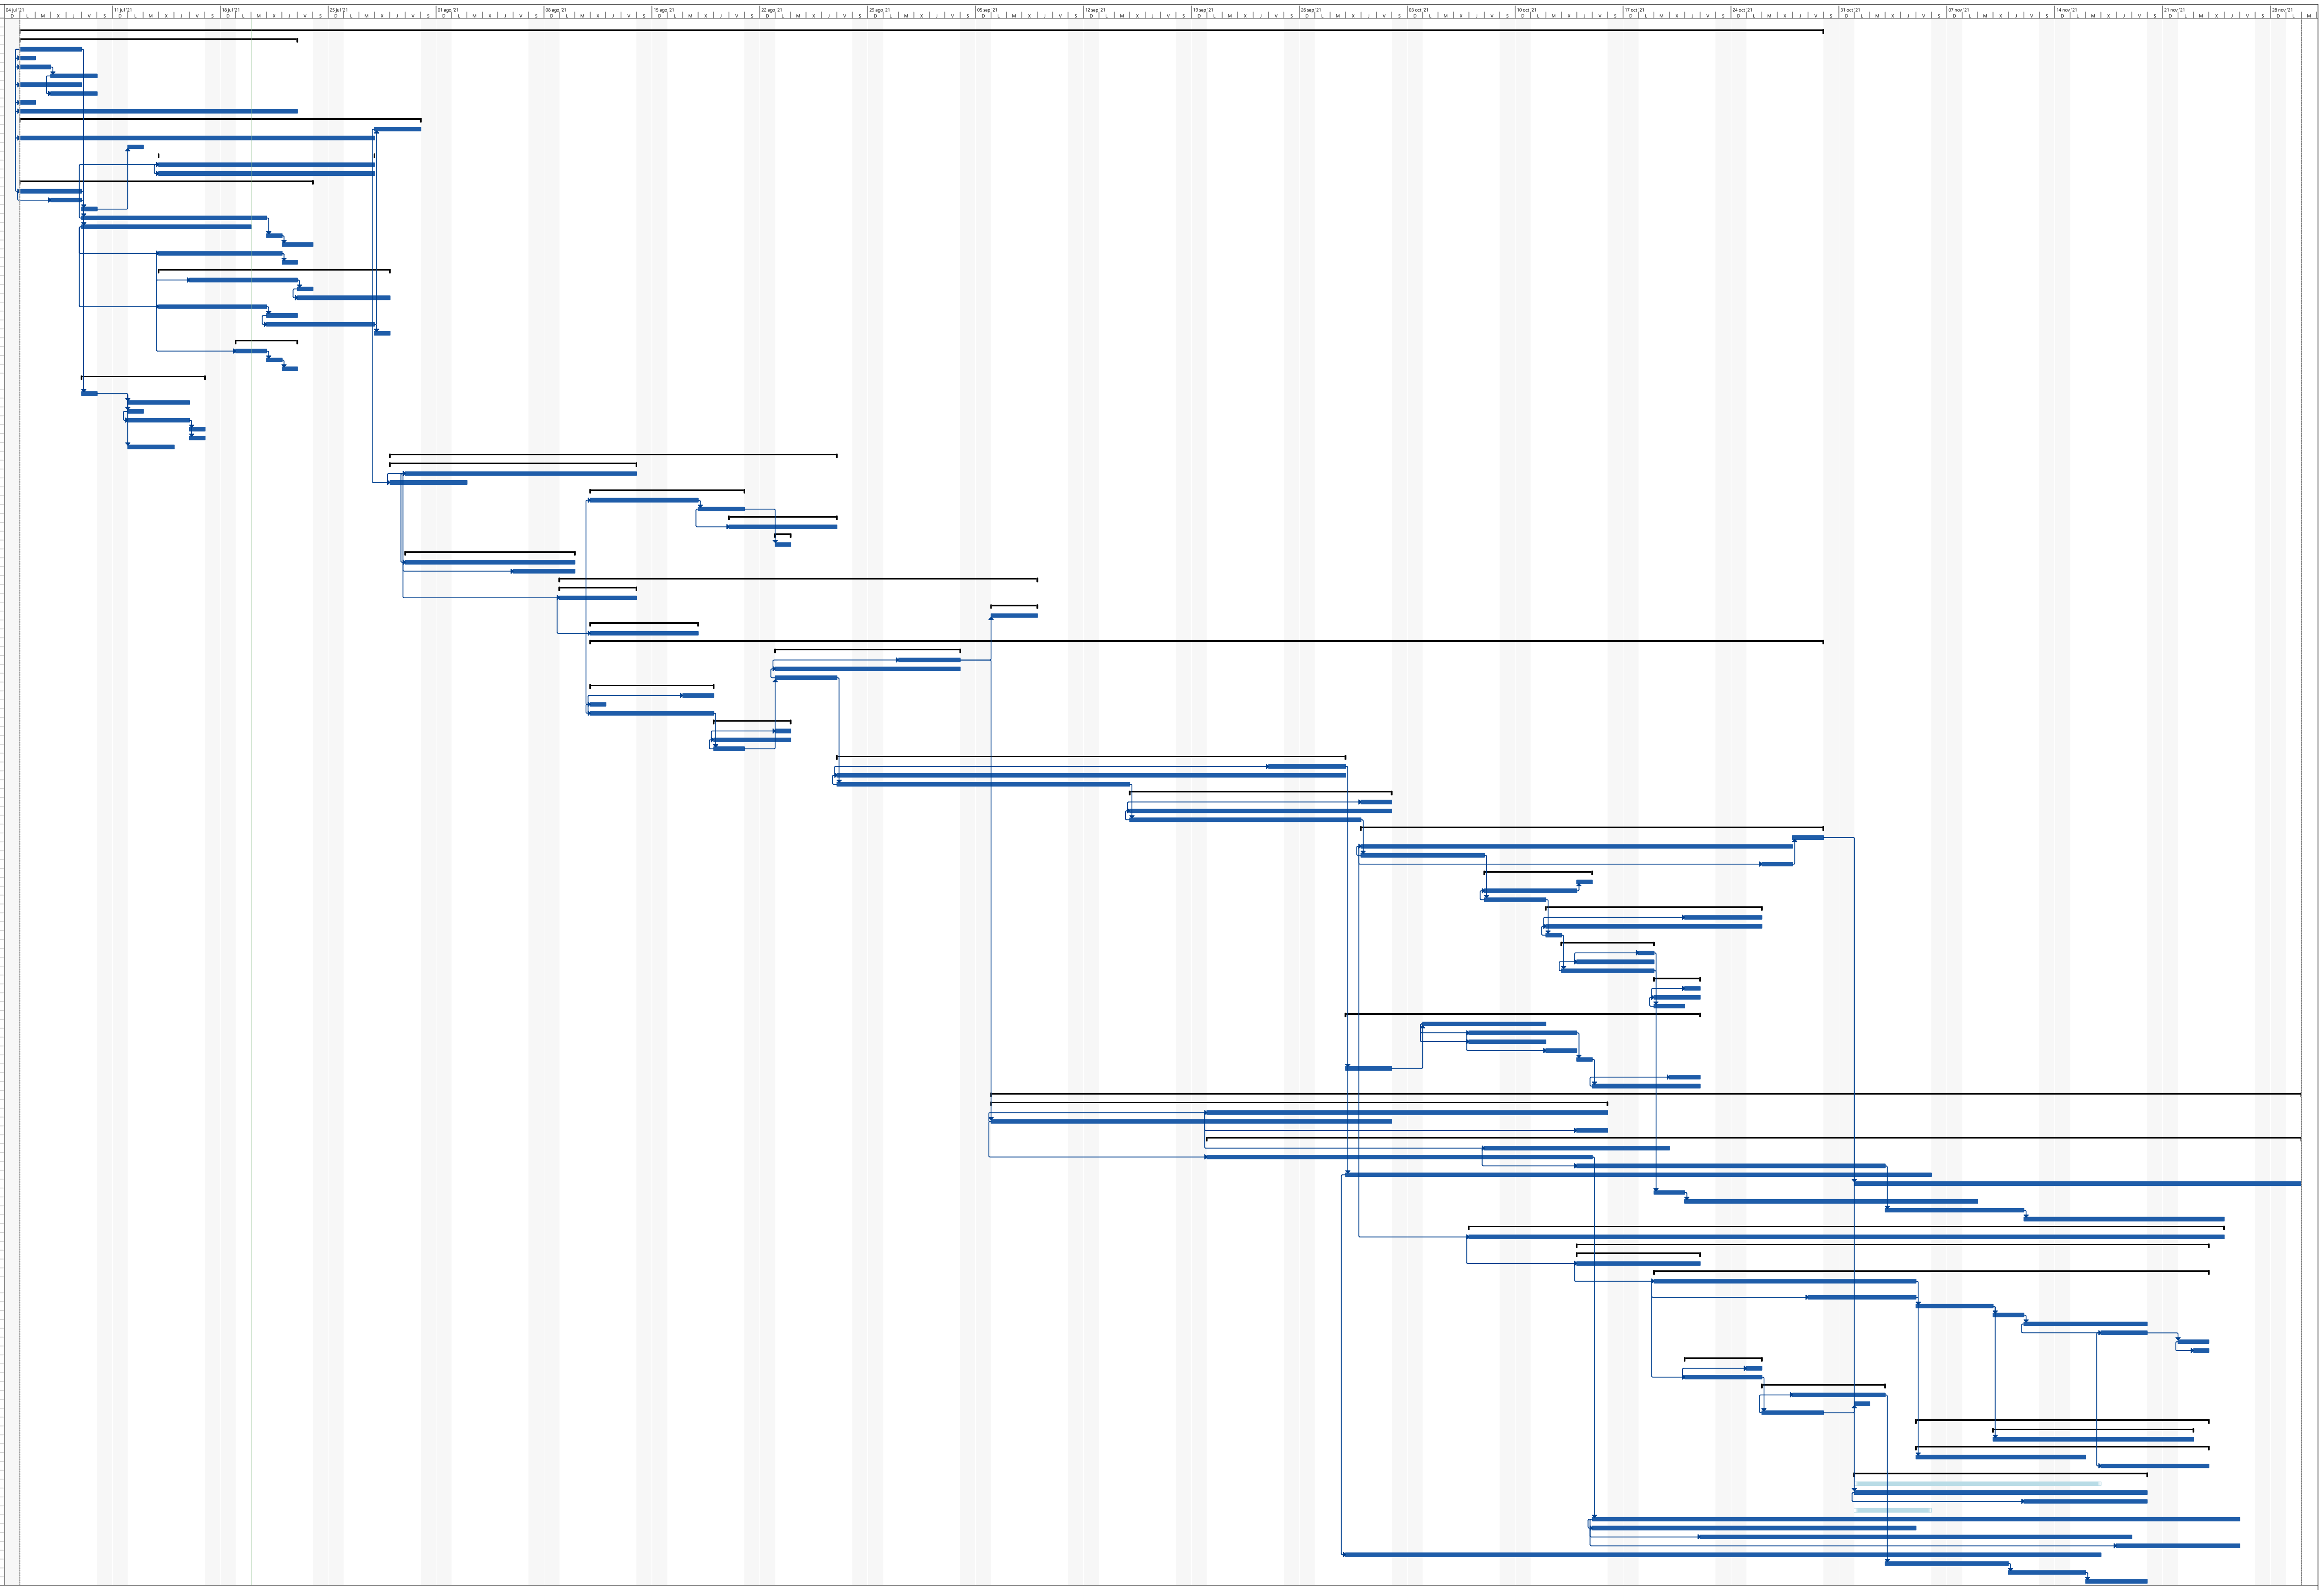

Proyecto: DIAGRAMA GANTT
Fecha: mar 20/07/21

Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo | solo fin | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Progreso | Progreso manual
