| Id | Nombre de tarea | Duración |
|---|---|---|
| 1 | ESTRUCTURAS | 122 días |
| 2 | OBRAS PROVISIONALES | 19 días |
| 3 | ALMACÉN, OFICINAS | 2 días |
| 4 | CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m | 1 día |
| 5 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA | 1 día |
| 6 | SERVICIOS HIGIÉNICOS | 1 día |
| 7 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2 días |
| 8 | SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA | 1 día |
| 9 | SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | 1 día |
| 10 | SEÑALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD | 17 días |
| 11 | TRABAJOS PRELIMINARES | 122 días |
| 12 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA | 2 días |
| 13 | LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA | 10 días |
| 14 | MOVILIZACION DE EQUIPO | 1 día |
| 15 | MITIGACION AMBIENTAL | 12 días |
| 16 | RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS | 10 días |
| 17 | PREVENCION DE DAÑOS - DERRAME DE COMBUSTIBLES | 10 días |
| 18 | DESMONTAJES | 6 días |
| 19 | DESMONTAJE DE VENTANAS | 1 día |
| 20 | DESMONTAJE DE PUERTAS | 1 día |
| 21 | DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE | 1 día |
| 22 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS | 1 día |
| 23 | DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO Y SOPOR | 1 día |
| 24 | DESMONTAJE DE COBERTURAS DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO (INC. LA ESTRUCTURA DE | 3 días |
| 25 | DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) | 3 días |
| 26 | DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL | 1 día |
| 27 | DEMOLICIÓN , REMOCION Y RASQUETEO | 7 días |
| 28 | DEMOLICIÓN DE PISO INC. C.P.- F.P. | 3 días |
| 29 | DEMOLICIÓN DE VEREDAS, PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES | 4 días |
| 30 | DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO | 1 día |
| 31 | DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO | 1 día |
| 32 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK (SOGA Y DE CANTO) | 1 día |
| 33 | DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO | 1 día |
| 34 | DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO | 4 días |
| 35 | DESMONTAJE DE CENTROS DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES) | 1 día |
| 36 | DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES | 1 día |
| 37 | DESMONTAJE DE CABLE DE CENTRO DE LUZ | 2 días |
| 38 | DESMONTAJE DE CABLE PARA TOMACORRIENTES | 1 día |
| 39 | DESMONTAJE DE TABLEROS | 1 día |
| 40 | PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19, PARA EL TRABAJO | 122 días |
| 41 | ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID 19 | 1 día |
| 42 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTRO DE TRABAJ | 120 días |
| 43 | EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO E INCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO | 120 días |
| 44 | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIA | 120 días |
| 45 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO | 1 día |
| 46 | MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA | 1 día |
| 47 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL | 4 días |
| 48 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 55 días |
| 49 | CORTE Y EXCAVACION | 13 días |
| 50 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMIENTOS CORRIDOS , PLATEAS Y ZAPATAS) | 13 días |
| 51 | CORTE DE MATERIAL SUELTO R=150 m3/dia (EQUIPO | 2 días |
| 52 | RELLENO | 10 días |
| 53 | RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIC | 7 días |
| 54 | RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO PREPARADO) | 2 días |
| 55 | RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON) | 1 día |
| 56 | CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE | 3 días |
| 57 | NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION | 3 días |
| 58 | MEJORAMIENTO DE TERRENO | 8 días |
| 59 | MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=50cm (COLOCACION DE OVER DE 1" A 6" - CON EQUIPO) | 1 día |
| 60 | MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=50cm (COLOCACION DE HORMIGON - CON EQUIPO) | 1 día |
| 61 | MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=30cm (COLOCACION DE HORMIGÓN - CON EQUIPO) | 1 día |
| 62 | MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO) | 2 días |
| 63 | MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=10cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO) | 3 días |
| 64 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL | 13 días |
| 65 | ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=30m) | 13 días |
| 66 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km) | 2 días |
| 67 | CONCRETO SIMPLE | 43 días |
| 68 | SOLADO | 3 días |
| 69 | SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=2", 1:12 C/I | 3 días |
| 70 | SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H | 2 días |
| 71 | FALSO PISO | 4 días |
| 72 | FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" | 4 días |
| 73 | CIMIENTOS | 7 días |
| 74 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. FC=100 Kg/cm | 4 días |
| 75 | CIMIENTOS CORRIDOS; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 3 días |
| 76 | CONCRETO ARMADO | 69 días |
| 77 | SOBRECIMIENTO | 10 días |
| 78 | SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 5 días |
| 79 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 9 días |
| 80 | SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | 9 días |
| 81 | ZAPATAS | 7 días |
| 82 | ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | 3 días |
| 83 | ZAPATAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 5 días |
| 84 | ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | 5 días |
| 85 | ZAPATAS.- ENTIBADO H=1.5-2.2m | 5 días |
| 86 | PLATEA DE CIMENTACIÓN | 7 días |
| 87 | PLATEA DE CIMENTACION.-CONCRETO f'c=210 kg/cm | 5 días |
| 88 | PLATEA DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 2 días |
| 89 | PLATEA DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | 2 días |
| 90 | VIGAS DE CIMENTACION | 5 días |
| 91 | VIGAS DE CIMENTACION.- CONCRETO fc=210kg/cm2 | 1 día |
| 92 | VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 4 días |
| 93 | VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | 3 días |
| 94 | COLUMNA | 13 días |
| 95 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM2 | 8 días |
| 96 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 11 días |
| 97 | COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | 11 días |
| 98 | VIGAS | 27 días |
| 99 | VIGAS - CONCRETO 210Kg/cm2 | 4 días |
| 100 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 9 días |
| 101 | VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | 9 días |
| 102 | LOSAS ALIGERADAS | 14 días |
| 103 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 | 3 días |
| 104 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 11 días |
| 105 | LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | 11 días |
| 106 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30 | 3 días |
| 107 | ESCALERAS | 5 días |
| 108 | ESCALERAS.- CONCRETO fc=210 kg/cm2 | 1 día |
| 109 | ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 4 días |
| 110 | ESCALERAS.- ACERO fy=4200 kg/cm2 | 3 días |
| 111 | LOSA MACISA | 15 días |
| 112 | LOSA MACISA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | 1 día |
| 113 | LOSA MACISA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 2 días |
| 114 | LOSA MACISA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | 4 días |
| 115 | CUNETAS CON REJILLA | 5 días |
| 116 | CUNETAS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 1 día |
| 117 | CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 4 días |
| 118 | CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | 3 días |
| 119 | CISTERNA | 3 días |
| 120 | CISTERNA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | 1 día |
| 121 | CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 2 días |
| 122 | CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | 3 días |
| 123 | BANCAS DE CONCRETO | 2 días |
| 124 | BANCAS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 1 día |
| 125 | BANCA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1 día |
| 126 | BANCAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | 1 día |
| 127 | ESTRUCTURAS METALICAS | 22 días |
| 128 | TIJERAL T-1(HABILITACION Y MONTAJE) | 5 días |
| 129 | VIGUETA METALICA VG1 (HABILITACIÓN Y MONTAJE) | 6 días |
| 130 | TEMPLADOR Y CRUZ DE SAN ANDRES | 2 días |
| 131 | APOYOS METALICOS FIJO Y MOVIL | 3 días |
| 132 | CANALETA FG 1.6MM | 2 días |
| 133 | COBERTURA LIVIANA | 7 días |
| 134 | ARQUITECTURA | 131 días |
| 135 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | 76 días |
| 136 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1:4 e=1.5cm | 14 días |
| 137 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M : 1:1:4 e=1.5cm | 9 días |
| 138 | MURO DE DRYWALL DOBLE ESTRUCTURA e= 1.5cm | 2 días |
| 139 | FIERRO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS | 2 días |
| 140 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | 85 días |
| 141 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | 8 días |
| 142 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES | 9 días |
| 143 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES | 9 días |
| 144 | TARRAJEO DE COLUMNAS | 12 días |
| 145 | TARRAJEO DE VIGAS | 7 días |
| 146 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | 5 días |
| 147 | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) | 10 días |
| 148 | BRUÑAS SEGÚN DETALLE | 5 días |
| 149 | CIELORRASOS | 12 días |
| 150 | CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5 | 12 días |
| 151 | PISOS Y PAVIMENTOS | 103 días |
| 152 | CONTRAPISOS | 4 días |
| 153 | CONTRAPISO DE 40 mm | 4 días |
| 154 | PISOS | 103 días |
| 155 | PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DOMINE MATE BLANCO- ALTO TRANSITO | 17 días |
| 156 | PISO CERAMICO 30 x 30 | 1 día |
| 157 | PISO CERAMICO 45 x 45 ALTO TRÁNSITO | 1 día |
| 158 | PISO DE CONCRETO EN PATIOS f'c=175kg/cm2; e=15cm FROTACHADO | 2 días |
| 159 | PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1 día |
| 160 | SARDINELES | 3 días |
| 161 | SARDINEL.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (INC. EXCAVACION) | 1 día |
| 162 | SARDINEL.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 2 días |
| 163 | VEREDAS Y RAMPAS | 8 días |
| 164 | VEREDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO | 4 días |
| 165 | RAMPAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO | 1 día |
| 166 | VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 3 días |
| 167 | ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS | 42 días |
| 168 | ZOCALOS | 7 días |
| 169 | ZOCALO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO | 7 días |
| 170 | CONTRAZOCALOS | 20 días |
| 171 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 50X60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE-ALTO TRANSITO | 12 días |
| 172 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 20X60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE-ALTO TRANSITO | 7 días |
| 173 | CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO | 5 días |
| 174 | COBERTURAS | 15 días |
| 175 | COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA) | 11 días |
| 176 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA | 4 días |
| 177 | CARPINTERIA DE MADERA | 9 días |
| 178 | PUERTA MACHIEMBRADA | 5 días |
| 179 | PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4" | 4 días |
| 180 | PIZARRA ACRILICA | 4 días |
| 181 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA | 104 días |
| 182 | CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA | 3 días |
| 183 | PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES | 7 días |
| 184 | ASTA DE BANDERA | 1 día |
| 185 | BARANDA METALICA EN ESCALERA | 1 día |
| 186 | REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION) | 8 días |
| 187 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCUENTRO METALICO ENTRE SOBRETECHO Y PARAPETO | 7 días |
| 188 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm | 3 días |

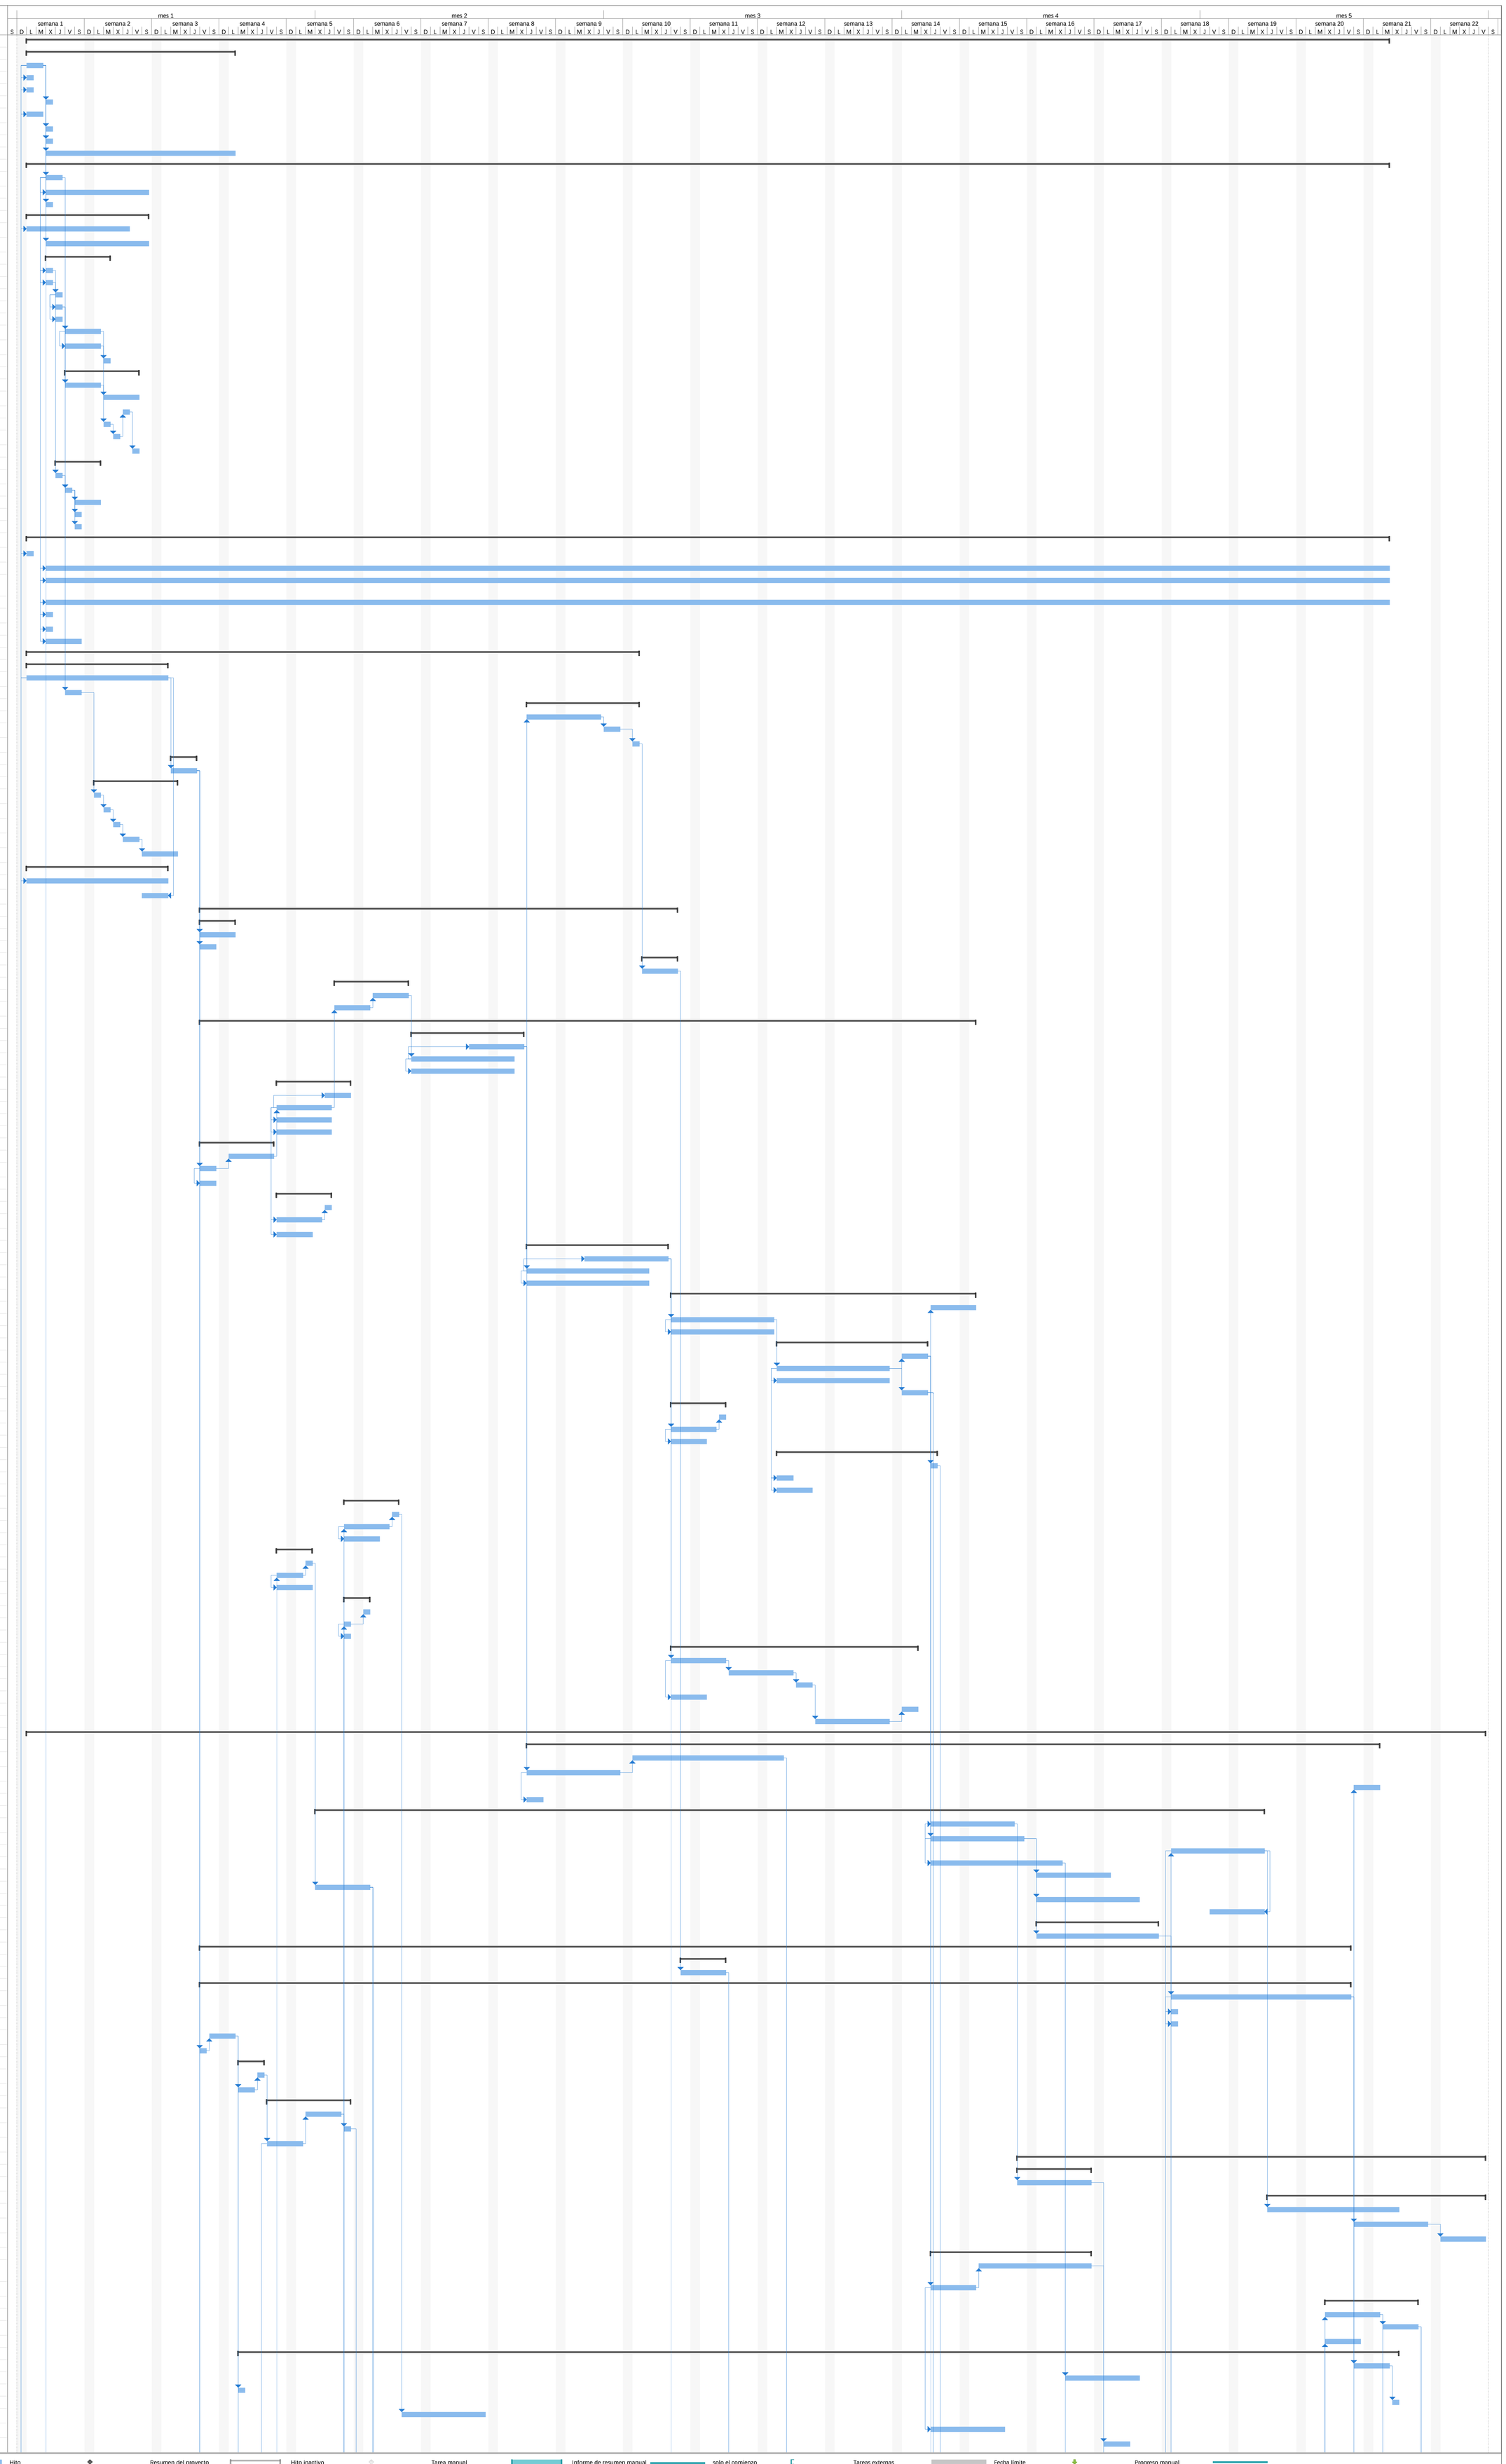


Proyecto: CRONOGRAMA GAN
Fecha: jue 10/02/22

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

| Id | Nombre de tarea | Duración |
|---|---|---|
| 189 | BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS | 2 días |
| 190 | ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO | 2 días |
| 191 | ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA | 1 día |
| 192 | PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA | 1 día |
| 193 | DIVISIONES METÁLICAS EN BAÑOS | 1 día |
| 194 | PUERTAS VAIVEN METÁLICAS EN BAÑOS | 1 día |
| 195 | TUBOS METÁLICOS EN CERCO PERIMÉTRICO | 4 días |
| 196 | VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS | 12 días |
| 197 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LÁMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS Y PROTECTOR DE SEGURIDAD | 12 días |
| 198 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE SEGURIDAD DE ALUMINIO | 8 días |
| 199 | CERRAJERIA | 95 días |
| 200 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS | 5 días |
| 201 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS | 2 días |
| 202 | CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS | 2 días |
| 203 | CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA | 1 día |
| 204 | PICAPORTE EN PUERTAS DE SS.HH | 1 día |
| 205 | CANDADO DE 60mm | 1 día |
| 206 | PINTURA | 31 días |
| 207 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS | 9 días |
| 208 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS | 5 días |
| 209 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA | 2 días |
| 210 | PINTURA EN PUERTAS DE MADERA | 3 días |
| 211 | JUNTAS | 86 días |
| 212 | JUNTA DE DILATACION EN PISOS CON TECNOPORT DE e= 3/8" RELLENO CON POLIURETANO | 2 días |
| 213 | JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLÁSTICA RELLENO CON POLIURETANO | 3 días |
| 214 | JUNTAS ASFALTICAS e=1" | 2 días |
| 215 | VARIOS | 30 días |
| 216 | CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO | 4 días |
| 217 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKER PARA SEÑALITICA DE SEGURIDAD | 2 días |
| 218 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO | 1 día |
| 219 | INSTALACIONES SANITARIAS | 101 días |
| 220 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 27 días |
| 221 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm | 2 días |
| 222 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL H<=3.00m | 5 días |
| 223 | RELLENO C/ARENA HASTA e=0.20m LA CLAVE PARA TUBO DE 160 Y 200 mm | 5 días |
| 224 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m | 5 días |
| 225 | REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm | 2 días |
| 226 | CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm | 2 días |
| 227 | SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR | 63 días |
| 228 | TUBERIA PVC-SAP 2" CLASE 10 | 2 días |
| 229 | TUBERIA PVC-SAP 1" CLASE 10 | 1 día |
| 230 | TUBERIA PVC-SAP 3/4" CLASE 10 | 1 día |
| 231 | VALVULA TIPO BOLA 1 1/2" | 1 día |
| 232 | CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS | 1 día |
| 233 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO (2,500L) | 1 día |
| 234 | SISTEMA DE RIEGO | 1 día |
| 235 | LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE ½" EN CAJUELA CONCRETO F'c 140 S/D | 1 día |
| 236 | SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR | 4 días |
| 237 | TUBERIA DE PVC SAL 4" | 1 día |
| 238 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-20 | 1 día |
| 239 | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO | 4 días |
| 240 | CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO | 1 día |
| 241 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR | 1 día |
| 242 | PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO | 2 días |
| 243 | PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO | 2 días |
| 244 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 54 días |
| 245 | INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS | 3 días |
| 246 | URINARIOS DE LOZA DE PICO | 1 día |
| 247 | LAVATORIO DE LOZA BLANCA | 3 días |
| 248 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | 1 día |
| 249 | PAPELERA DE CERAMICA | 1 día |
| 250 | TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20 | 1 día |
| 251 | ESPEJO BISELADO | 1 día |
| 252 | PAPELERA PLASTICA | 1 día |
| 253 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE | 1 día |
| 254 | MESA CORRIDA DE CONCRETO REVEST. C/CERÁMICO | 4 días |
| 255 | INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE | 11 días |
| 256 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC | 5 días |
| 257 | SALIDA PARA VENTILACION | 3 días |
| 258 | TUBERIA PVC-SAL 2" | 4 días |
| 259 | TUBERIA PVC-SAL 4" | 3 días |
| 260 | REGISTROS DE BRONCE DE 4" | 2 días |
| 261 | REGISTROS DE BRONCE DE 2" | 2 días |
| 262 | PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE | 2 días |
| 263 | INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA | 9 días |
| 264 | SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC | 5 días |
| 265 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA | 1 día |
| 266 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA | 1 día |
| 267 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" | 1 día |
| 268 | CAJA DE MADERA PARA VALVULA | 1 día |
| 269 | PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA | 1 día |
| 270 | TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO | 57 días |
| 271 | TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3" | 1 día |
| 272 | TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10 | 1 día |
| 273 | TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10 | 1 día |
| 274 | TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2" | 1 día |
| 275 | TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" | 1 día |
| 276 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA | 1 día |
| 277 | VALVULA CHECK 2" | 1 día |
| 278 | VALVULA CHECK 1 1/2" | 1 día |
| 279 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" | 1 día |
| 280 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" | 1 día |
| 281 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" | 1 día |
| 282 | VALVULA FLOTADORA 1 1/2" | 1 día |
| 283 | VALVULA FLOTADORA 3/4" | 1 día |
| 284 | CAJA BAYPAS DE CONCRETO | 1 día |
| 285 | CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA | 1 día |
| 286 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO | 1 día |
| 287 | TAPA DE FIERRO EN CISTERNA | 1 día |
| 288 | REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN. 2" | 1 día |
| 289 | REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA 4" | 1 día |
| 290 | ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO | 1 día |
| 291 | ROMPE AGUA | 1 día |
| 292 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 38 días |
| 293 | TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm | 2 días |
| 294 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 200mm ISO 4435 S-20 | 1 día |
| 295 | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 18" X 24" CON TAPA DE CONCRETO | 1 día |
| 296 | RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES | 1 día |
| 297 | EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA | 1 día |
| 298 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 130 días |
| 299 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 69 días |
| 300 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO DE 100 x 100 cm | 4 días |
| 301 | REFINE, NIVELACION DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 100 CM | 1 día |
| 302 | RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 100 x 100 cm | 4 días |
| 303 | CONDUCTORES, DUCTOS Y ACCESORIOS | 61 días |
| 304 | CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm2 N2XOH BLANCO | 1 día |
| 305 | CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 VERDE | 2 días |
| 306 | CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 BLANCO | 4 días |
| 307 | CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 NEGRO | 4 días |
| 308 | CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 BLANCO | 1 día |
| 309 | CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 NEGRO | 1 día |
| 310 | CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 VERDE | 1 día |
| 311 | CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm2 NH-80 VERDE | 1 día |
| 312 | CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 35mm2 | 1 día |
| 313 | TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS | 4 días |
| 314 | TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS | 1 día |
| 315 | TUBERIA PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS | 1 día |
| 316 | CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150 | 1 día |
| 317 | SISTEMA DE TUBERIA CONDUIT EMT INC. ACCESORIOS | 5 días |
| 318 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION - LUMINARIAS / TOMACORRIENTES | 51 días |
| 319 | SmartLED Office W60L60 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 4 LAMPARAS | 4 días |
| 320 | SmartLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 2 LAMPARAS | 2 días |
| 321 | INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMÉTICA) 2 LAMPARA | 2 días |
| 322 | BERYL ADOSADA LED 15W | 1 día |
| 323 | LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LEDS | 1 día |
| 324 | Reflector Josfel Hall Ligth Led 250W asimétrico o EQUIVALENTE | 2 días |
| 325 | DICROICO PARA PISO | 2 días |
| 326 | CAJA OCTOGONAL F"G" DE 100mm x 55mm | 2 días |
| 327 | INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR | 1 día |
| 328 | INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR | 1 día |
| 329 | INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR | 1 día |
| 330 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE | 1 día |
| 331 | TOMACORRIENTE DOBLE C/T | 1 día |
| 332 | CAJA RECTANGULAR F"G" DE 100 x 55 x 50mm | 1 día |
| 333 | TIMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR | 1 día |
| 334 | TABLERO ELECTRICO TRIFASICO/ MONOFASICO | 2 días |
| 335 | TABLERO ELECTRICO DE F"G" EMPOTRADO 8 POLOS | 1 día |
| 336 | TABLERO ELECTRICO DE F"G" EMPOTRADO 18 POLOS | 1 día |
| 337 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS | 1 día |
| 338 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 15A | 1 día |
| 339 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 35A | 1 día |
| 340 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES | 1 día |
| 341 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20 A/30mm A | 1 día |
| 342 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A/30mm A | 1 día |
| 343 | CIRCUITOS DE MANDO DE ILUMINACION DE PATIOS | 1 día |
| 344 | PULSADOR LUMINOSO NA 220V IP66 | 1 día |
| 345 | CONTACTOR TRIFASICO 25A | 1 día |
| 346 | PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL | 8 días |
| 347 | POZO CONEXION A TIERRA | 8 días |
| 348 | BUZON ELECTRICO | 1 día |
| 349 | BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8 | 1 día |
| 350 | ELECTROBOMBA | 1 día |
| 351 | TABLERO DE ELECTROBOMBAS | 1 día |
| 352 | TRANSPORTE DE MATERIALES | 1 día |
| 353 | TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALES) | 1 día |
| 354 | COMUNICACIONES | 22 días |
| 355 | TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS | 1 día |
| 356 | CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150 | 1 día |
| 357 | CAJA RECTANGULAR F"G" DE 100 x 55 x 50mm | 1 día |
| 358 | CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE | 4 días |
| 359 | CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE (incluye todas las gestiones necesarias) | 4 días |
| 360 | CONTINGENCIA | 10 días |
| 361 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | 11 días |

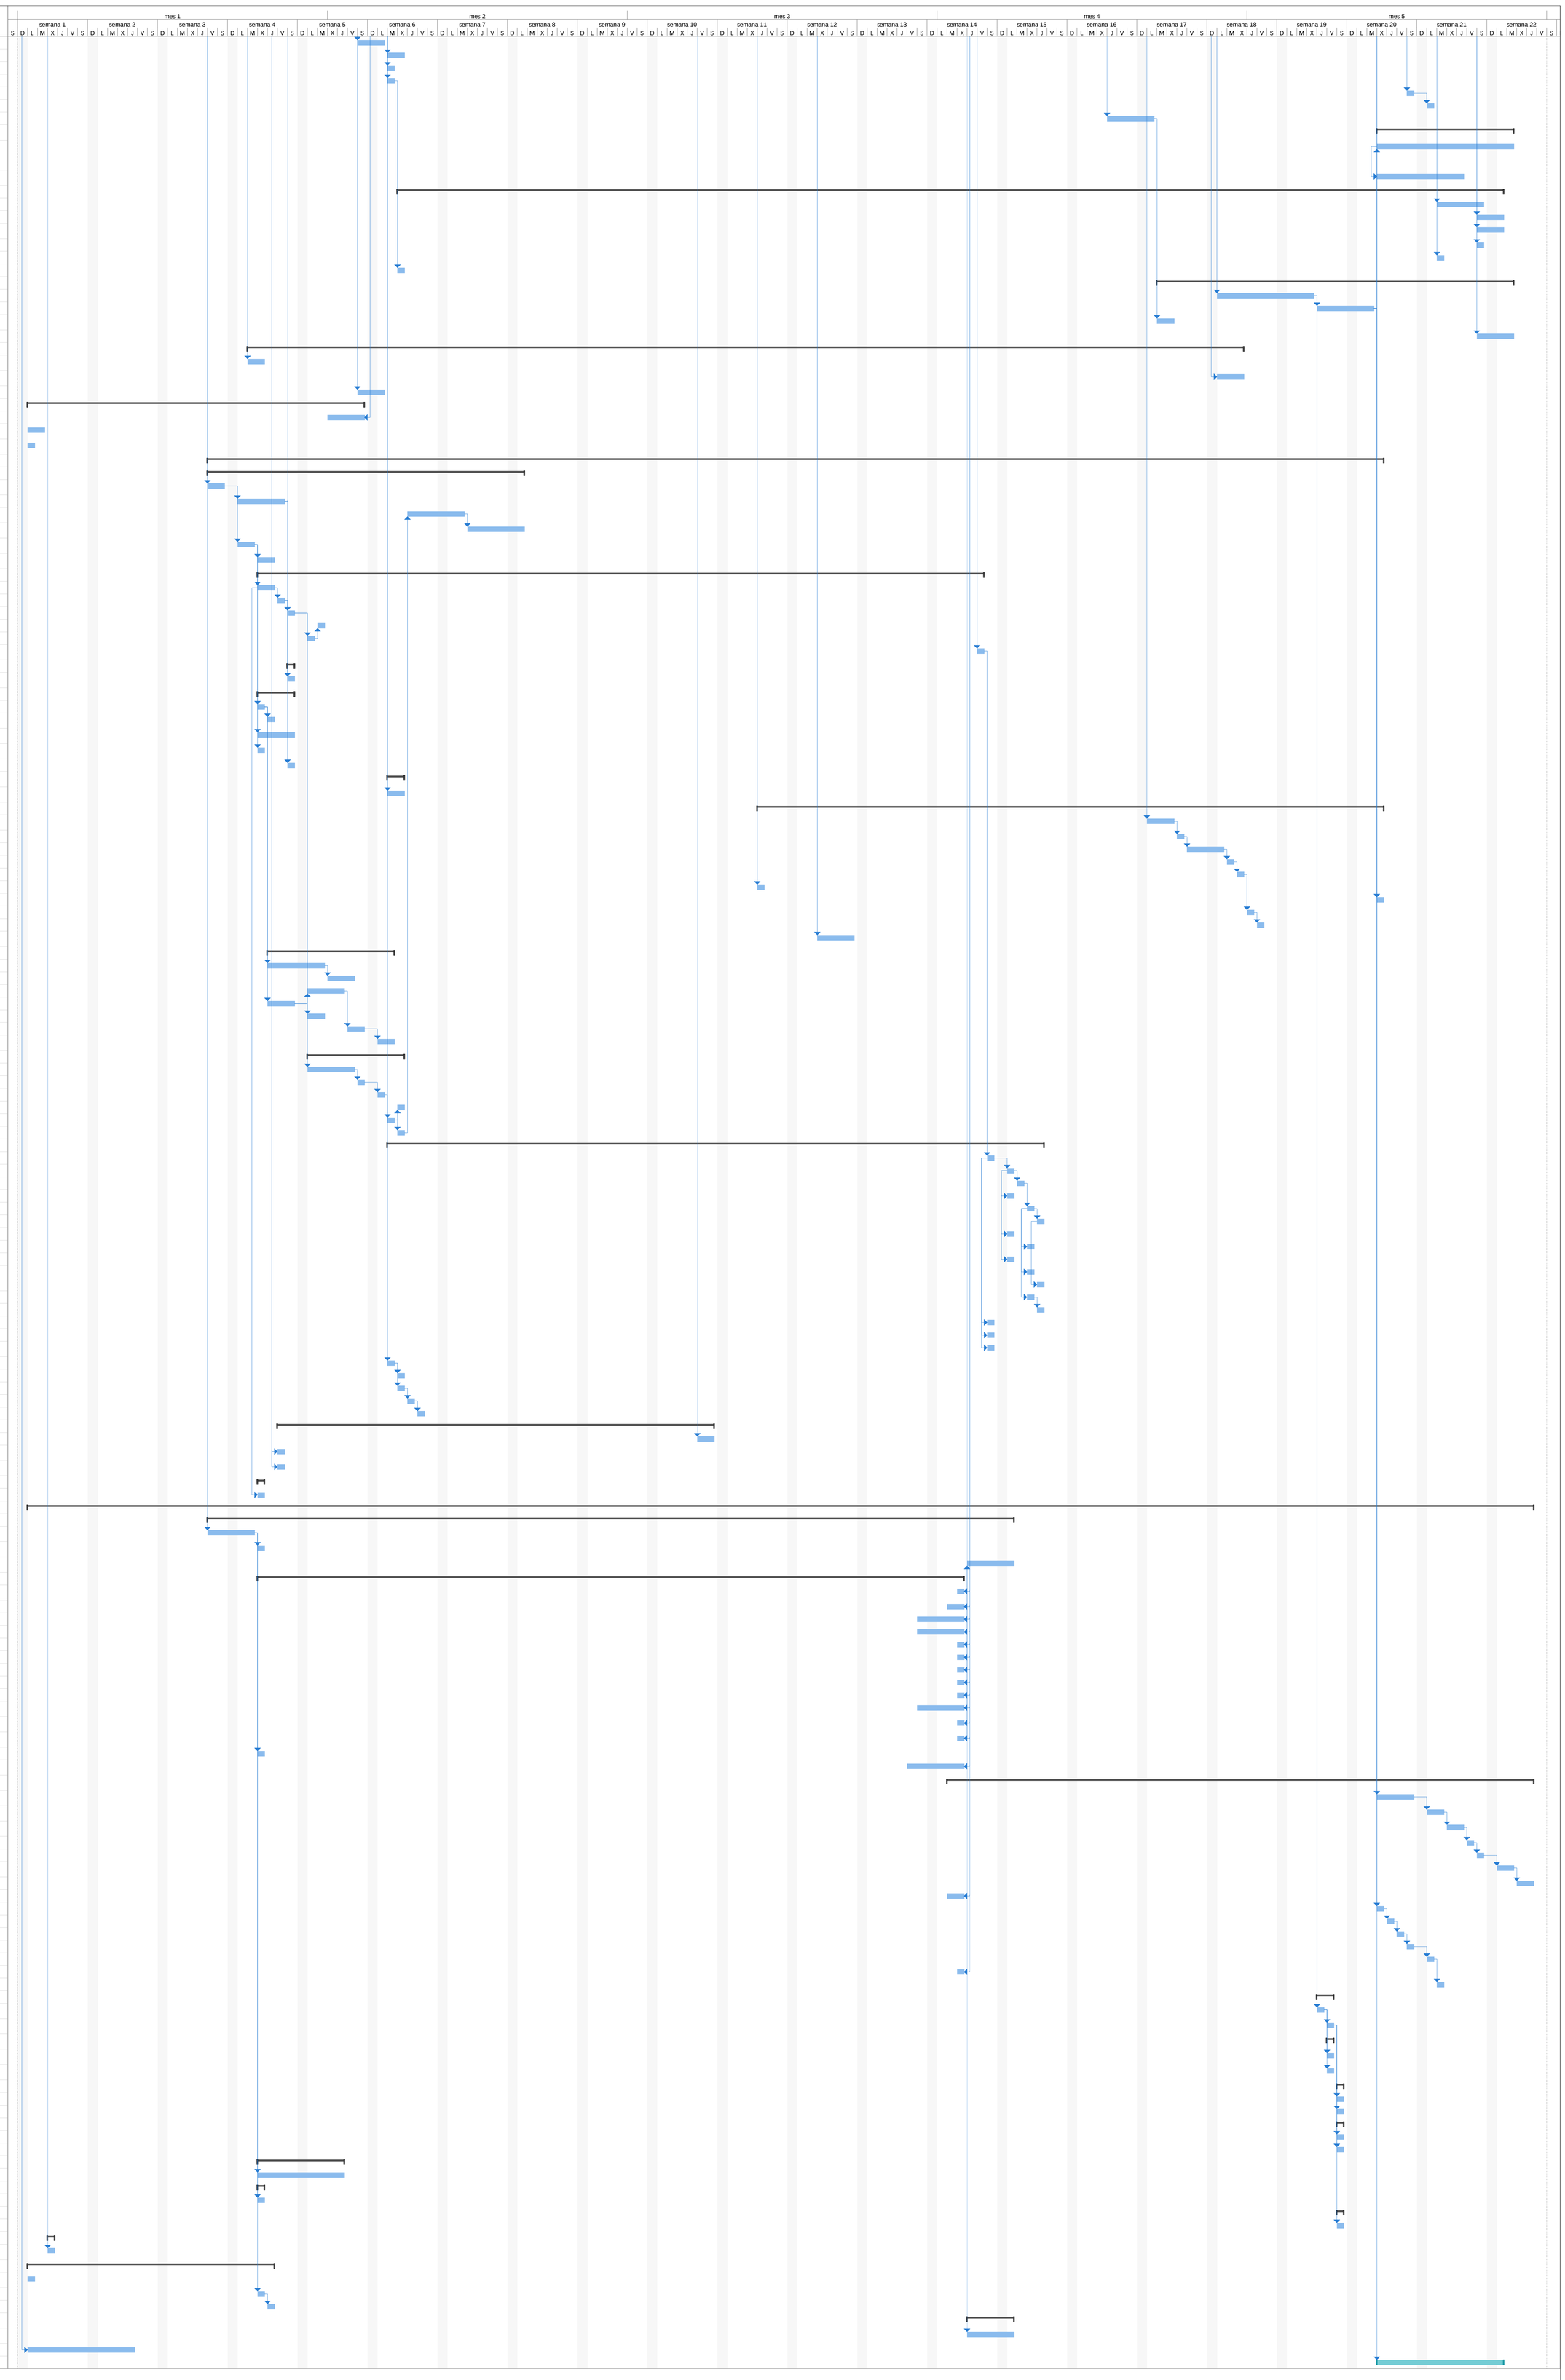


Proyecto: CRONOGRAMA GAN
Fecha: jue 10/02/22

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
