CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20111 CON CÓDIGO LOCAL 413524 DISTRITO DE CATACAOS- PIURA - PIURA

Id		Nombre de tarea
1		ESTRUCTURAS
2		OBRAS PROVISIONALES
12		TRABAJOS PRELIMINARES
16		MITIGACION AMBIENTAL
19		DESMONTAJES
27		DEMOLICIÓN , REMOCION Y RASQUETEO
35		DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO
39		MOVIMIENTO DE TIERRAS
40		CORTE Y EXCAVACION
43		RELLENO
47		CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE
49		MEJORAMIENTO DE TERRENO
51		ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL
53		CONCRETO SIMPLE
54		SOLADO
56		FALSO PISO
58		CIMIENTOS
60		CONCRETO ARMADO
61		SOBRECIMIENTO
65		ZAPATAS
69		VIGAS DE CIMENTACION
73		COLUMNA
77		PLACAS
81		VIGAS
85		LOSAS ALIGERADAS
90		ESCALERAS
94		CUNETAS CON REJILLA
98		CISTERNA
102		TANQUE ELEVADO
106		ESTRUCTURAS METALICAS
108		ARQUITECTURA
109		MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
114		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
123		CIELORRASOS
125		PISOS Y PAVIMENTOS
126		CONTRAPISOS
128		PISOS
134		SARDINELES
137		VEREDAS Y RAMPAS
140		ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS
141		ZOCALOS
143		CONTRAZOCALOS
148		COBERTURAS
152		CARPINTERIA DE MADERA
156		CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
172		VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDR
174		CERRAJERIA
181		PINTURA
187		JUNTAS
192		JUEGOS INFANTILES
194		VARIOS
199		INSTALACIONES SANITARIAS
200		MOVIMIENTO DE TIERRAS
206		SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR
213		SISTEMA DE RIEGO
215		SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR
220		PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE
222		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
233		INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE
241		INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA
248		TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO
270		SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
274		RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES
277		INSTALACIONES ELECTRICAS
278		MOVIMIENTO DE TIERRAS
282		CONDUCTORES, DUCTOS Y ACCESORIOS
298		ARTEFACTOS DE ILUMINACION - LUMINARIAS / TOMACORRIE
314		TABLERO ELECTRICO TRIFASICO/ MONOFASICO
318		INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS
321		INTERRUPTORES DIFERENCIALES
324		CIRCUITOS DE MANDO DE ILUMINACION DE PATIOS
327		POSTES DE F°G°
330		PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL
332		BUZON ELECTRICO
334		ELECTROBOMBA
336		TRANSPORTE DE MATERIALES
338		COMUNICACIONES
342		CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE
344		PLAN DE CONTINGENCIA
345		AMBIENTES PREFABRICADOS
352		INSTALACIONES SANITARIAS
355		INSTALACIONES ELECTRICAS
357		VARIOS

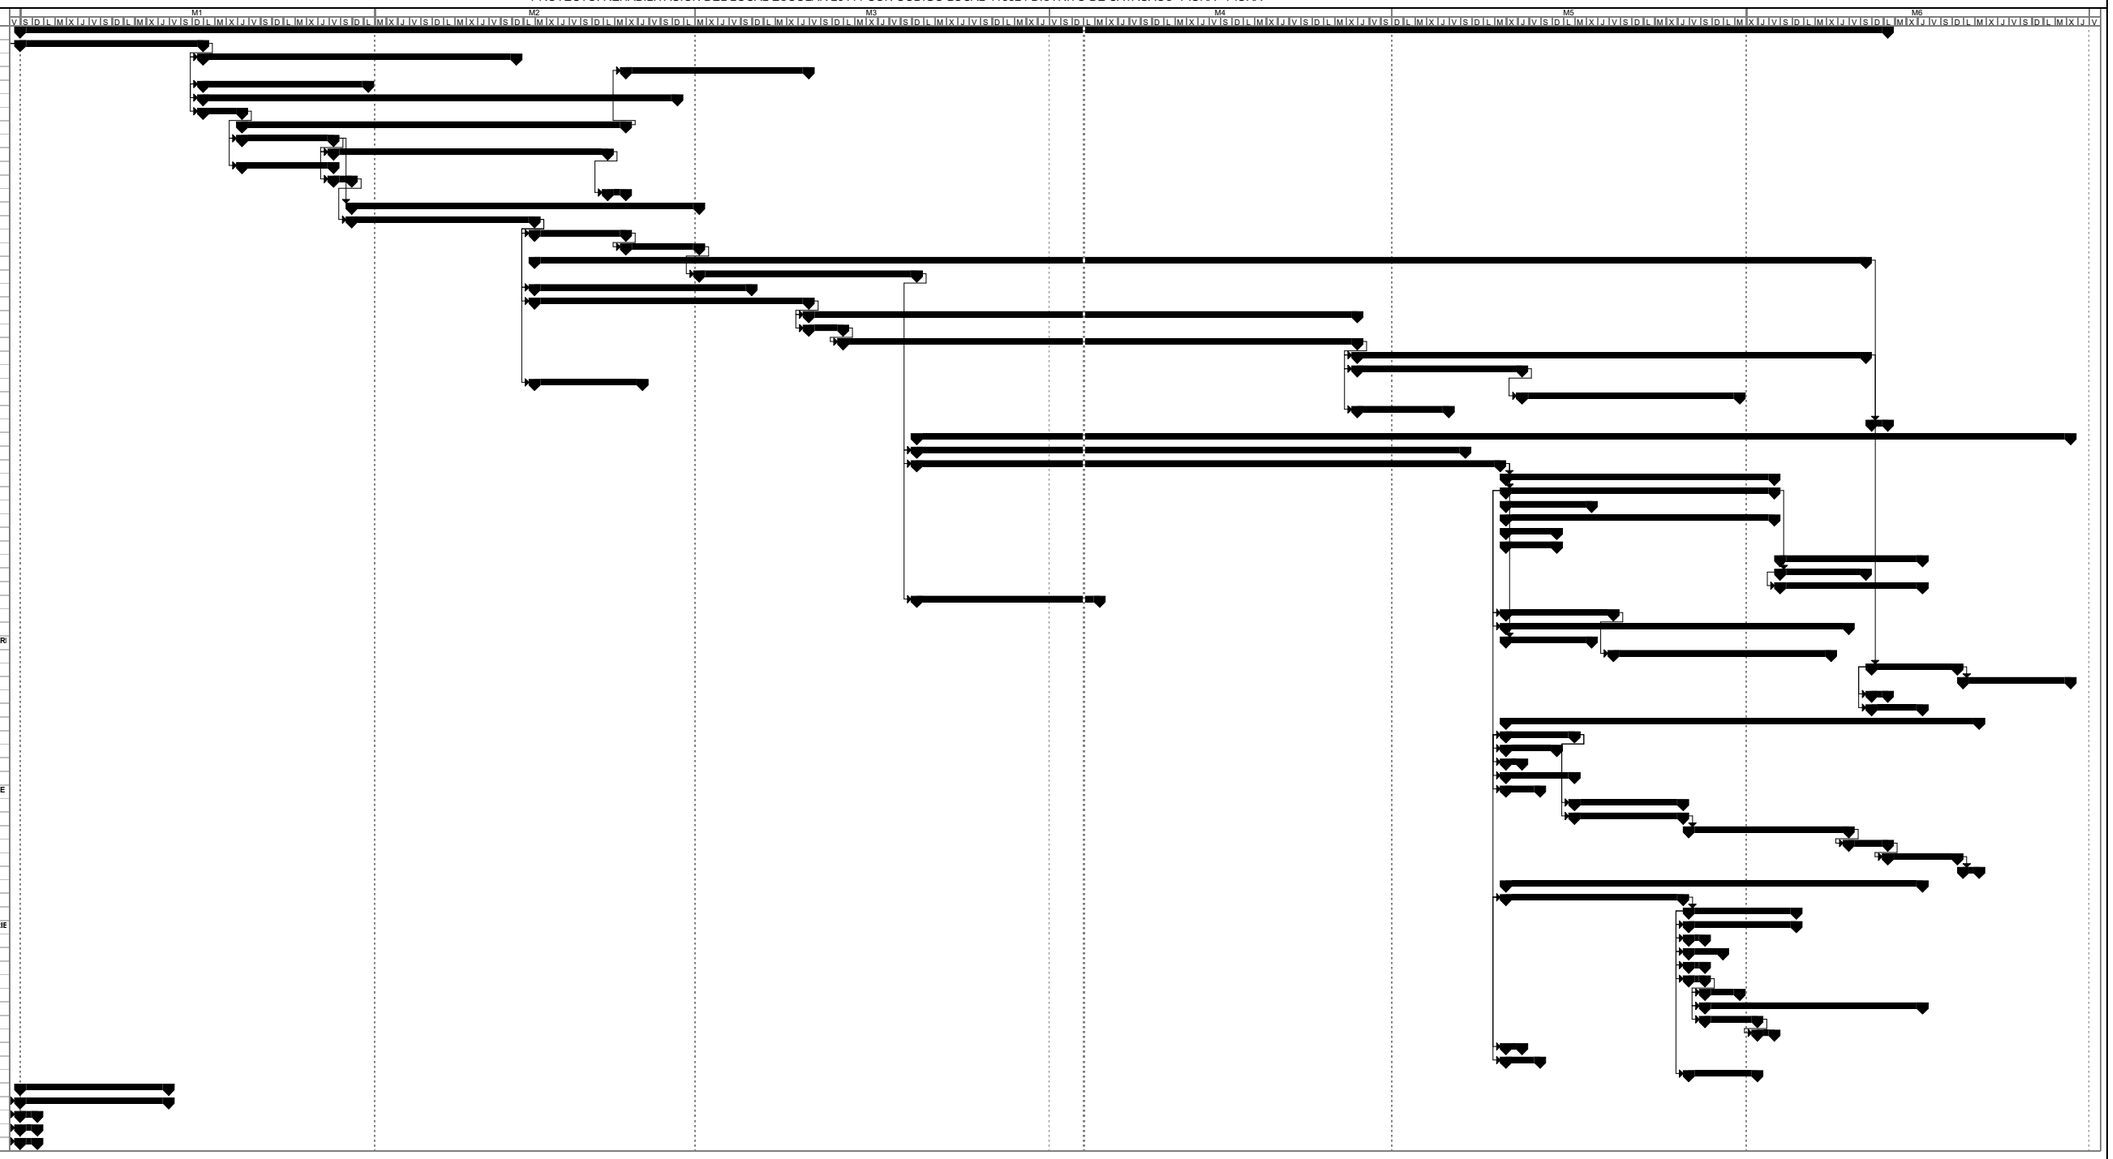

Proyecto: CRONOGRAMA GENER
Fecha: lun 04/04/22

Tarea | División | Progreso | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite
